

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
 TEC080710M22
 Tels.:(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx
 4272728119
 LADA SIN COSTO:
 800 623 0332

Nº 20236

CLIENTE 26597

SUC - 18394

NOMBRE DEL CLIENTE: ALFREDO MEDINA ESPARZA FECHA: 06.06.22
 RAZÓN SOCIAL: 22010 TIJUANA, S.C.
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: FRIDA KALO # 10410 ZONA URBANA RÍO TIJUANA.
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: ESQUINE SIQUEIRAS, CP. 22010 TIJUANA, B.C.
 TELÉFONO: 664 198 2813 CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: ES UN EDIFICIO EN USO, TORRE MEDIA.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES OTRO _____
 CONDICIONES PARA INGRESAR: HORARIO DE 9:00 AM A 6:00 PM.
 DOCUMENTOS: LOS BÁSICOS.

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: _____ %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: RAMPA DUPLICADORA DE ESTACIONAMIENTO TR EVOLUTIVO

CLASIFICACIÓN	TIPO DE CABINA		
CARGA <input type="checkbox"/>	CAMILLAS <input type="checkbox"/>	MEDIDA 1.10 M <input type="checkbox"/>	ELEVACIÓN <u>2.10</u>
DISCAPACITADOS <input type="checkbox"/>	TIJERAS <input type="checkbox"/>	SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) <input type="checkbox"/>	ESTACIONES _____
AUTOS <input type="checkbox"/>	UNDER RAMP <input type="checkbox"/>	COMPLETA 2.10 M <input type="checkbox"/>	CAPACIDAD DE CARGA <u>7000 lbs</u>
			UNIDAD HIDRÁULICA <u>2 HP.</u>

DIMENSIÓN DE FOSO:

LARGO _____	ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM <input type="checkbox"/>
ANCHO _____	ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM <input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD _____	ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM <input type="checkbox"/>
	DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO _____ ANCHO _____

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM². ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO

FOSO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA

GUÍA MECÁNICA EN PROCESO.

SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA PARED

SI TUBERÍA DELGADA

NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA

ACCESORIOS EXTRAS COSTOS

ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

 FECHA DE TÉRMINO _____ FIRMA _____

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES

BLANCO SILVER METALLIC

AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO _____

AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR

SOLICITUD ADICIONAL: DE LINEA.

CRISTAL

METAL DESPLEGADO CLARO

LÁMINA PINTOR TINTEX

OTRO _____ ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

APD JESÚS A. BARRERA
 TECNORAMPA

Martha Batalla Batalla
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

CLIENTE 24597 SUL - 18394

Nº 20236

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA


REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: ES UNA TORRE MEDICA EN USO
CON 408 / TRASE GENERADOR.


DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V 220 V GENERADOR


- CONEXION A MURO
- CABLE DE CUES =
3 mts.

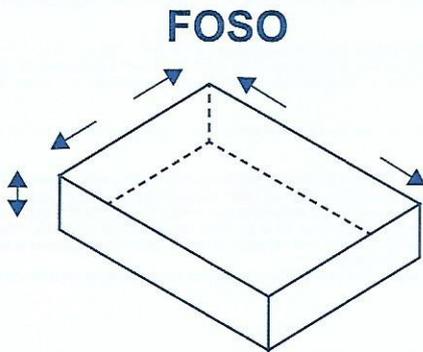

CABINA
← 2.10 →



INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA



BOTONERAS

PEDESTAL SOBREPUESTAS EMPOTRADAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA
ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA _____

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

Martha Batalla
Alfredo Medina Esparza

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: Martha Batalla TELÉFONO 1): 664 198 2813
CONTACTO 2): Alfredo Medina E. TELÉFONO 2): 664 347 3397

ATA Jesús A. CENLPER
TECNORAMPA

Martha Batalla Batalla
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
