

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

①

NOMBRE DEL CLIENTE: Luis Miguel Fernandez FECHA: 14/Sep/2019  
 RAZÓN SOCIAL: Multifunciones especializadas del Centro  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Sabes el vicario, Aposoa el grande  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: guanguato  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Escuela plazas libres

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO   
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS   
 No. PARTES  OTRO -  
 EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 CONDICIONES PARA INGRESAR: Accesos Libros patin de arena HORARIO: Libro  
 DOCUMENTOS: IFE OTROS \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 80 %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador cabina semicompleta 2 accesos

**CLASIFICACIÓN** CARGA  CAMILLAS   
 DISCAPACITADOS  TIJERA   
 AUTOS  UNDER RAMP   
**TIPO DE CABINA** MEDIA 1.10 M   
 SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)   
 COMPLETA 2.10 M   
 ELEVACIÓN 3.30m  
 ESTACIONES 2 est  
 CAPACIDAD DE CARGA 500kg  
 UNIDAD HIDRÁULICA 2Hp

DIMENSIÓN DE FOSO: LARGO 2.20m ANCHO 1.48m PROFUNDIDAD 0.20m  
 ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30m ANCHO 1.25m

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA Incluir panel de seguridad, amortiguadores y brida

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE: SI NO  
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS    
 TECNORAMPA GUÍA MECÁNICA   
 SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
**TUBERÍA** SI  TUBERÍA   
 NO  CANALETA   
**PARED** DELGADA   
 GRUESA

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA** INSTALADA  NO INSTALADA  OTRO   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

ACABADO DEL ELEVADOR

**COLORES** BLANCO  SILVER METALLIC   
 AZUL / GRIS  PANTONE  CÓDIGO \_\_\_\_\_  
 AZUL / BLANCO  ALUCOBOND COLOR   
**CRISTAL** METAL DESPLEGADO   
 LÁMINA PINTRO   
 OTRO \_\_\_\_\_  
 CLARO   
 TINTEX   
 ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

[Firma]  
 Asq. Mariana Olvera  
 TECNORAMPA

[Firma]  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE



NOTA:

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



NOTA:

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: - Pendiente: foso - Estructura - Alimentación eléctrica - Botoneras.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN


110 V  220V  GENERADOR  \* Revisar Avance.

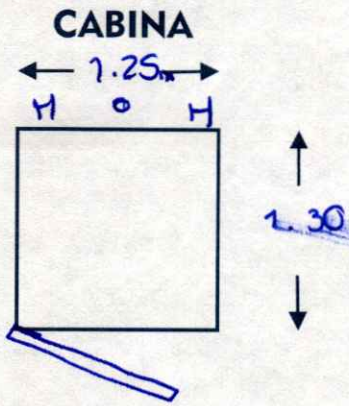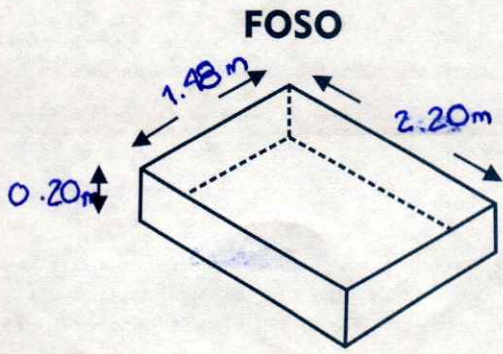

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

- PEDESTAL
- SOBREPUESTAS
- DISTANCIA APROXIMADA
- ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.00m.
- EMPOTRADAS
- CANALIZADAS POR TECNORAMPA



EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Arq. Mariana Olvera  
TECNORAMPA

[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
