

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
 TEC080710M22
 Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx
 0142772728119
 LADA SIN COSTO:
 018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: Grupo PG SA de CV FECHA: 18-sep-18
 RAZÓN SOCIAL: Grupo PG SA de CV
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Cav. Chichimequillas Km 8.5, San Jose el Alto QRO
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Cereso Femenil de Querétaro
 TELÉFONO: 4424389629 CORREO: abr.aig76@hotmail.com

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Curso Femenil Acceso amplio
Estacionamiento

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES 1 OTRO _____

CONDICIONES PARA INGRESAR: INE, No permitido celular, llaves, memoria
 DOCUMENTOS: INE

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 50 %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Cabina media discapitados estandar

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
 CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10M ELEVACIÓN 3.10m
 DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) ESTACIONES 2 est.
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10M CAPACIDAD DE CARGA 500kg
 UNIDAD HIDRÁULICA 2HP

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
 LARGO 1.74m ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ANCHO 1.50m ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 PROFUNDIDAD 0.20m DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.29m

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA Botonera braille

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO TECNORAMPA
 FOSO GUÍA MECÁNICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA SOLICITUDES ADICIONALES _____
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA TUBERÍA PARED
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA SI TUBERÍA DELGADA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

Aig. Alejandro Cereso
29-sep-18 [Firma]
 FECHA DE TÉRMINO FIRMA

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES ACABADO DE ELEVADOR
 BLANCO SILVER METALLIC METAL DESPLEGADO CRISTAL
 AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO _____ LÁMINA PINTOR TINTEX
 AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR OTRO _____ ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICA Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

[Firma] Alejandro Cereso Garcia
 TECNORAMPA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.



OBSERVACIONES GENERALES: Revisar la colocación de último refuerzo a 2.82m

* Cliente revisar plano estructural para ver posibilidad de un refuerzo a menor altura

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V 220 V GENERADOR

* Revisar abatimiento en zest

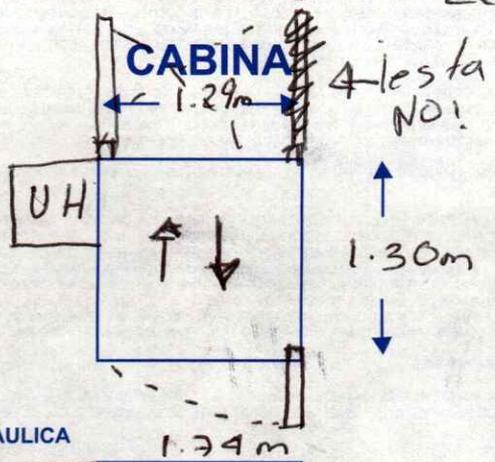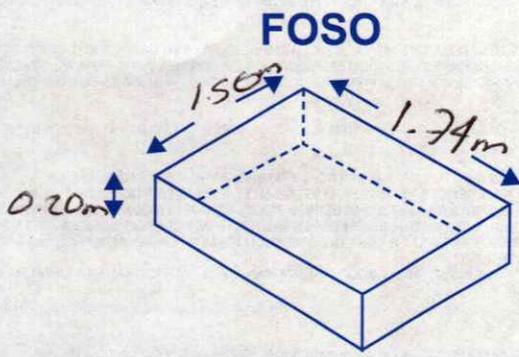


INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL SOBREPUESTAS DISTANCIA APROXIMADA EMPOTRADAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 250m

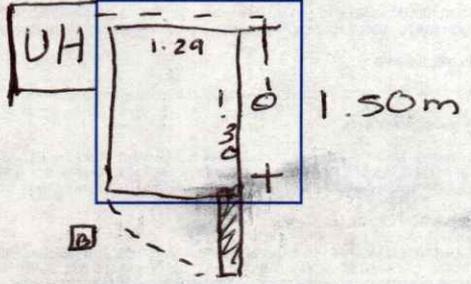

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

Arg. Silvia Paéz

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: Arg. Alejandro Cerco TELÉFONO 1): 9929 3896 29
CONTACTO 2): _____ TELÉFONO 2): _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Luis Arceaga
TECNORÁMPA

ALEJANDRO CERCO GARCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
