

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:
01 800 6330 332, 01 800 8380 850
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Centro Deportivo Esporal A.C FECHA: 15 JUN 18
 RAZÓN SOCIAL: Centro Deportivo Esporal A.C
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Miguel de Cervantes Saavedra #103 Col. Petulera
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Alfarras de tienda comercial HEB
Ejército Mexicano TELÉFONO: 835 213 9133 CORREO: administracion@centrodeportivo.com
 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Club Deportivo y Social
Acceso abierto

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO
 COLUMNAS LARGAS CORTAS
 No. PARTES 2
 EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 OTRO Equipamiento
 CONDICIONES PARA INGRESAR: Identificación TecnoRampa HORARIO: 8am a 6pm
 DOCUMENTOS: INE OTROS _____

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 60 %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Cabina Semicompleta dimensiones por cliente
CLASIFICACIÓN
 CARGA CAMILLAS
 DISCAPACITADOS TIJERA
 AUTOS UNDER RAMP
TIPO DE CABINA
 MEDIA 1.10 M
 SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)
 COMPLETA 2.10 M
 ELEVACIÓN 3.16m
 ESTACIONES 2
 CAPACIDAD DE CARGA 500kg
 UNIDAD HIDRÁULICA 2HP

DIMENSIÓN DE FOSO:
 LARGO 1.663
 ANCHO 1.493
 PROFUNDIDAD 20cm
 ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.29 ANCHO 1.21

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA Panel de Seguridad (cotizar)

TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE:	SI	NO	TECNORAMPA
FOSO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GUÍA MECÁNICA <input checked="" type="checkbox"/>
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOLICITUDES ADICIONALES _____
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
TUBERÍA
 SI TUBERÍA
 NO CANALETA
PARED
 DELGADA
 GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 INSTALADA NO INSTALADA OTRO _____
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL Panel de Seguridad
 NOMBRE Y FIRMA _____ FECHA DE TÉRMINO _____ FIRMA _____

ACABADO DEL ELEVADOR

COLORES
 BLANCO SILVER METALLIC
 AZUL / GRIS PANTONE CÓDIGO _____
 AZUL / BLANCO ALUCOBOND COLOR
METAL DESPLEGADO
LÁMINA PINTRO
OTRO _____
CRISTAL
 CLARO
 TINTEX
 ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

NOTA:

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



NOTA:

REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: Reforzar base 10cm, Colocar refuerzo a 4.8m altura


DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V 220V GENERADOR

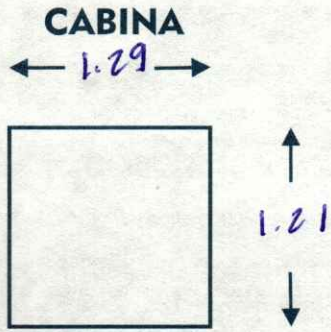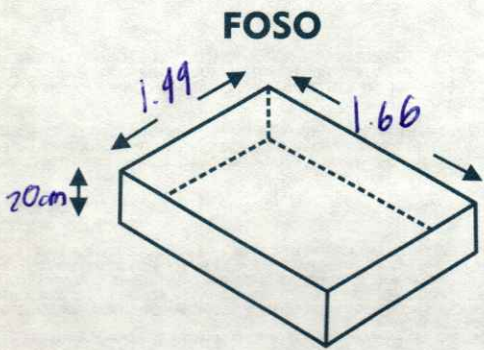

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

- BOTONERAS
- PEDESTAL
- SOBREPUESTAS
- DISTANCIA APROXIMADA
- ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 2HP
- EMPOTRADAS
- CANALIZADAS POR TECNORAMPA

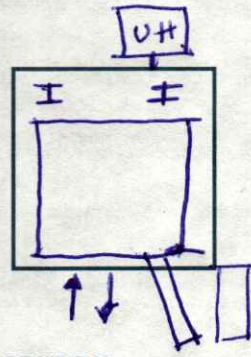

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

Paul González
Manuel Velázquez

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: Paul González

FIRMA: [Signature]

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Paul González

Paul González
