

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.:(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx  
 4272728119  
 LADA SIN COSTO:  
 800 623 0332

Nº 20219

NOMBRE DEL CLIENTE: ARQ EMERALDA ORTEGA FECHA: 21 SEP 2021  
 RAZÓN SOCIAL: CECM  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: BUILD. LUIS PONCERO COLOSIO 340 CAL LOS TROjes  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: AGENCIA BMW AUTOMOTRIZES  
 TELÉFONO: 477 142 0840 CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: ESPACIO AMPLIO PARA LA UENADA DE LA PLATAFORMA.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES  OTRO NINGUNO

CONDICIONES PARA INGRESAR: SIN PROBLEMAS PARA LABORAR, HORARIO DE 8:00am

DOCUMENTOS: A 5:00pm, los documentos basicos.

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 35 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ELEV DE RIGOS TIPO PLATAFORMA.

<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>TIPO DE CABINA</b>		
CARGA <input type="checkbox"/> CAMILLAS <input type="checkbox"/>	MEDIDA 1.10 M <input type="checkbox"/>	ELEVACIÓN <u>7.00</u>	
DISCAPACITADOS <input type="checkbox"/> TIJERAS <input type="checkbox"/>	SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) <input type="checkbox"/>	ESTACIONES <u>3</u>	
AUTOS <input checked="" type="checkbox"/> UNDER RAMP <input type="checkbox"/>	COMPLETA 2.10 M <input type="checkbox"/>	CAPACIDAD DE CARGA <u>3500kg</u>	
		UNIDAD HIDRÁULICA <u>10 HP.</u>	

DIMENSIÓN DE FOSO:

LARGO 5.50 ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM

ANCHO 3.15 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM

PROFUNDIDAD .60 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM  60 cm. foso.

DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 5.30 ANCHO 2.35

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM². ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA PUERTA HIDRÁULICA EN ENTRADA ES. 1.

**TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:**

<b>CLIENTE:</b>	SI NO	<b>TECNORAMPA</b>
FOSO	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	GUÍA MECÁNICA <input type="checkbox"/> <u>EN PROCESO</u>
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	SOLICITUDES ADICIONALES <u>PUERTA HIDRÁULICA EN ESPALDÓN 1.</u>
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

**TUBERÍA**

SI  TUBERÍA  DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTOS   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_

**RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA**

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

COLORES ACABADOR DE LINEA. SE DEFINE POR CORBEO.

BLANCO <input type="checkbox"/>	SILVER METALLIC <input type="checkbox"/>	METAL DESPLEGADO <input type="checkbox"/>	CLARO <input type="checkbox"/>
AZUL/GRIS <input type="checkbox"/>	PANTONE <input type="checkbox"/>	LÁMINA PINTOR <input type="checkbox"/>	TINTEX <input type="checkbox"/>
AZUL/BLANCO <input type="checkbox"/>	ALUCOBOND COLOR <input type="checkbox"/>	OTRO _____	ESMERILADO <input type="checkbox"/>

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_  
ARQ JESÚS A BENITEZ ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR  
Carlos David De la Cruz NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

Nº 20219

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: SE PROPONEN DEJAR MOTOR Y TABLERO EN EL MISMO ESPACIO DEL ELEV. CREW ENO. TRABAJOS DE OBRA EN PROCESO. SE TIENE QUE TRAER SU PROPIO GENERADOR.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V  220 V  GENERADOR

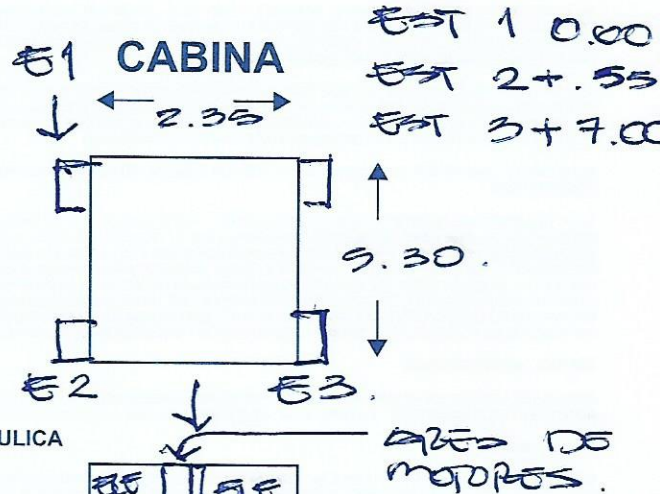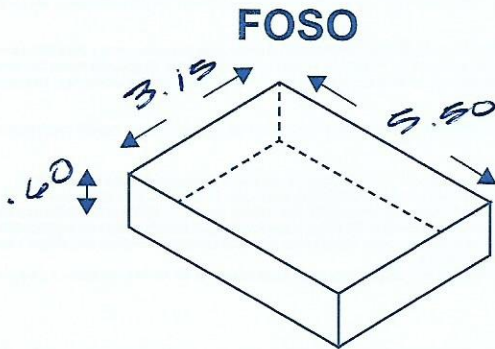

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL  SOBREPUESTAS  DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA \_\_\_\_\_

EMPOTRADAS  CANALIZADAS POR TECNORAMPA

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

Carlos David De la Cruz Avardos

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: Carlos David De la Cruz TELÉFONO 1): 4472649958 CONTACTO 2): \_\_\_\_\_ TELÉFONO 2): \_\_\_\_\_

Signature of Carlos David De la Cruz Avardos, TECNORAMPA

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Signature of Carlos David De la Cruz Avardos, NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
