

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecorampa.com.mx  
 0142772728119  
 LADA SIN COSTO:  
 018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: ING. EDUARDO CONSTANTINO FECHA: 23. NOV. 2019  
 RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES BEC.  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: COLONIA MONTEBUENOS CALLE SAO JUAN 5/JUQUETA  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: ESCUELA MILITARIA  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: ESCUELA MUNDO DE WANDID BLANCO Y AZUL.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES  2 MMS OTRO \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES PARA INGRESAR: WORLD AVIAR A ING. EDUARDO CONSTANTINO  
 DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 90% %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: GRUPO SEMICOMPLETA

**CLASIFICACIÓN** TIPO DE CABINA  
 CARGA  CAMILLAS  MEDIDA 1.10M  ELEVACIÓN 6.68  
 DISCAPACITADOS  TIJERAS  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M)  ESTACIONES 3  
 AUTOS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10M  CAPACIDAD DE CARGA 500 kg.  
 UNIDAD HIDRÁULICA 3HP

DIMENSIÓN DE FOSO:  
 LARGO 2.295 ELEVADORES DE TIJERA, 45CM   
 ANCHO 1.355 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 PROFUNDIDAD 20 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.155

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

**TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:**

CLIENTE: SI NO TECNORAMPA  
 FOSO   GUÍA MECÁNICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA   SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_  
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS   REVISAR SI COLOCAR PATAS PARA COLOCAR EL BIFIL AL FONDO.  
 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 → INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 TUBERÍA PARED  
 SI  TUBERÍA  DELGADA   
 NO  CANALETA  GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA  
 INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

COLORES ACABADO DE ELEVADOR  
 BLANCO  SILVER METALLIC  METAL DESPLEGADO  CRISTAL  ARRIBA  
 AZUL/GRIS  PANTONE  LÁMINA PINTOR  TINTEX   
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR  OTRO \_\_\_\_\_ ESMERILADO   
 SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

[Firma] ING. EDUARDO CONSTANTINO HD62  
 TECNORAMPA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

**NOTA**

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



**NOTA**

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: --ACABADOS A 200 mts.

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V     220 V     GENERADOR

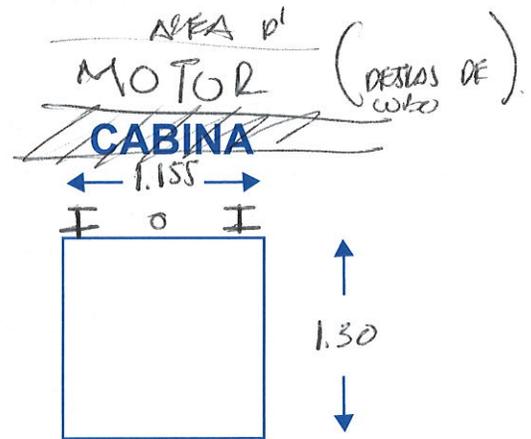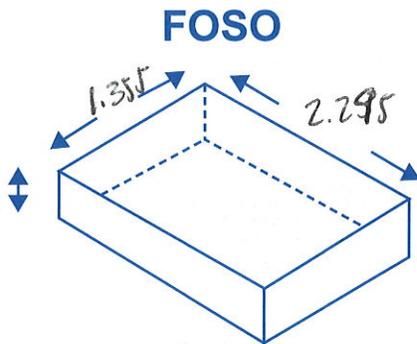


**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**

**BOTONERAS**

PEDESTAL   
SOBREPUESTAS

EMPOTRADAS  
 CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 2.00

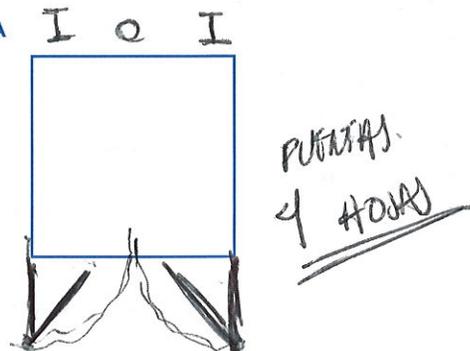

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

**NOTA:**

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

**PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO**

NOMBRE: \_\_\_\_\_ TELÉFONO 1): \_\_\_\_\_  
CONTACTO 2): \_\_\_\_\_ TELÉFONO 2): \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

*[Handwritten signature]*  
TECNORAMPA

*[Handwritten signature]*  
ING. EDWIN CONSTANTINO HDGZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
