

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx  
 0142772728119  
 LADA SIN COSTO:  
 018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: Ramón Galante FECHA: 13 OCT 2020  
 RAZÓN SOCIAL: RGA ARQUITECTOS  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: OUTLET SAN MARTÍN LOCAL 104-F  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: FUENTE A MOBICO - AL FONDO DEL OUTLET  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: CLÍNICA DE HEMODIÁLISIS

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  ALFEO 1.0 INT.  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 No. PARTES  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 OTRO COVID

CONDICIONES PARA INGRESAR: ANIMAL A CUENTE

DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 10 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: EQUIPO DE CULGA

**CLASIFICACIÓN** **TIPO DE CABINA**

CARGA  CAMILLAS  MEDIDA 1.10M  ELEVACIÓN 3.25  
 DISCAPACITADOS  TIJERAS  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M)  ESTACIONES 2  
 AUTOS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10M  CAPACIDAD DE CARGA 500 Kg.  
 UNIDAD HIDRÁULICA 2HP.

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM   
 LARGO 1.80 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ANCHO 1.55 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 PROFUNDIDAD 20 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.35 ANCHO 1.35

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI  NO   
 FOSO    
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA    
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS    
 TECNORAMPA   
 GUÍA MECÁNICA   
 SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA   
 TUBERÍA SI  NO  PARED TUBERÍA  CANALETA  DELGADA  GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_  
 RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA DE TÉRMINO \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES BLANCO  SILVER METALLIC  METAL DESPLEGADO  CRISTAL CLARO   
 AZUL/GRIS  PANTONE  LÁMINA PINTOR  TINTEX   
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR  OTRO \_\_\_\_\_ ESMERILADO   
 CÓDIGO \_\_\_\_\_

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_ ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA \_\_\_\_\_ NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE \_\_\_\_\_

**NOTA**

8968

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA**



REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: - REVISAR Opciones como ACCESO  
- TABLERO LONA ANTICULSISA Y EXTINTOR  
- TABLERO CABLES PARA PROTEGER PISO.

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V  220 V  GENERADOR

EXTENSIÓN 30 MT  
TABLERO PASIVA PARA  
CONECTARSE A  
PISTO

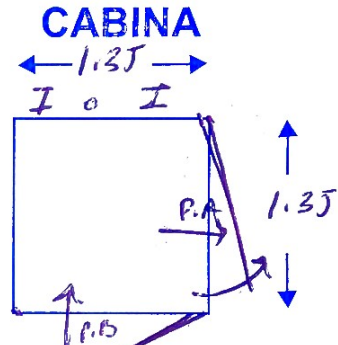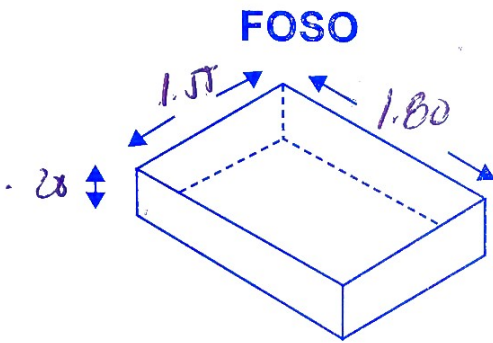

**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**

**BOTONERAS**


PEDESTAL  SOBREPUESTAS

P. ALTA

EMPOTRADAS  CANALIZADAS POR TECNORAMPA

P. BAJA

DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5.00



**EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:**

**NOTA:** PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

**PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO**

NOMBRE: \_\_\_\_\_ TELÉFONO 1): \_\_\_\_\_  
CONTACTO 2): \_\_\_\_\_ TELÉFONO 2): \_\_\_\_\_

[Signature]  
TECNORAMPA

[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
