

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
 TEC080710M22
 Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx
 0142772728119
 LADA SIN COSTO:
 018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: ALONSO NAVARRO DOMÍNGUEZ FECHA: 26-10-22
 RAZÓN SOCIAL: PRO AND
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CARRERA LAS TRAYAS - LOS PINOS Km 15 LAS TRAYAS,
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: EMILIANO ZAPATA, VILLAHUAYAS C. 91030 EMP PASAJER
 TELÉFONO: _____ CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: PLANTA DE FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS PARA ENVIOS - ESPACIO AMPLO

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES OTRO _____
 CONDICIONES PARA INGRESAR: PLANTA PROCESO EN CURSO DISEÑO
 DOCUMENTOS: IMSS - INE

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 0 %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ELEVADOR DE CARRO

CLASIFICACIÓN CARGA CAMILLAS TIJERAS UNDER RAMP
TIPO DE CABINA MEDIDA 1.10M SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) COMPLETA 2.10M
 ELEVACIÓN 3.00
 ESTACIONES 2
 CAPACIDAD DE CARGA 600 kg.
 UNIDAD HIDRÁULICA 10 HP

DIMENSIÓN DE FOSO: LARGO 3.30 ANCHO 2.70 PROFUNDIDAD 0.60
 ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 2.50 ANCHO 2.50

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO
 FOSO
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS
 TECNORAMPA
 GUÍA MECÁNICA EN PROCESO
 SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 TUBERÍA PARED
 SI TUBERÍA DELGADA
 NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 INSTALADA NO INSTALADA
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____
 RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA
 NOMBRE Y FIRMA _____ FECHA DE TÉRMINO _____ FIRMA _____

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES POR ESTIPAR
 BLANCO SILVER METALLIC
 AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO _____
 AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR
 SOLICITUD ADICIONAL: _____
 METAL DESPLEGADO CRISTAL CLARO
 LÁMINA PINTOR TINTEX
 OTRO _____ ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICA Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Alfonso A. Benítez Cruz TECNORAMPA Alonso Navarro Domínguez NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA



REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: PLANTA DE PROCESOS, OBRA NUEVA
ESPACIOS AMPLIOS, TRAER CARRO PARA TRANSPORTAR
MATERIALES AL INTERIOR.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V 220 V GENERADOR


ACCESO 180°
PUERTAS A 2 HOJAS

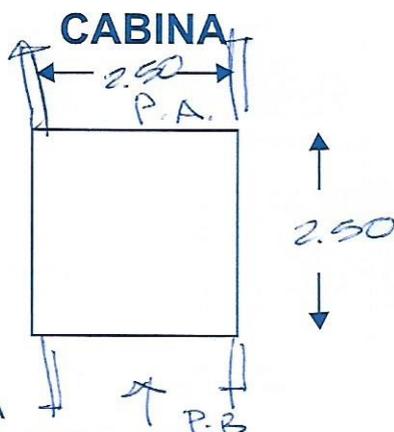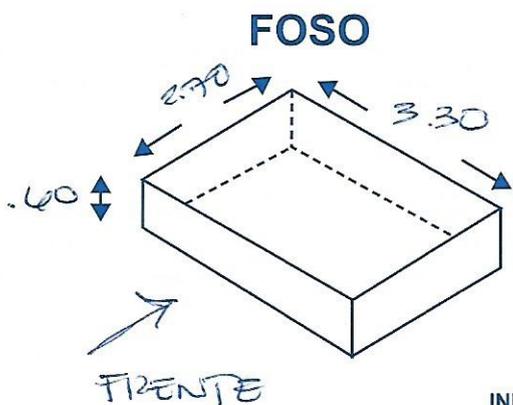

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BASE
ELECTRICA
TABLERO
Y
MOTOR.

- EMPOTRADAS
- CANALIZADAS POR TECNORAMPA



BOTONERAS

- PEDESTAL
- SOBREPUESTAS

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.5 mts.

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

- ALONSO NAVARRO DOMÍNGUEZ
- ALAN ALVAREZ

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: ALONSO NAVARRO
CONTACTO 2): ALAN ALVAREZ

TELÉFONO 1): 55 22 47 03 3A
TELÉFONO 2): 52 83 65 85 06

Juan A. Benitez
TECNORAMPA

Alonso Navarro Domínguez
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
