

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
 TEC080710M22
 Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@teconrampa.com.mx
 0142772728119
 LADA SIN COSTO:
 018006230332

LOT-33667

NOMBRE DEL CLIENTE: ALEJANDRO AMEZCUA FECHA: 10-11-22
 RAZÓN SOCIAL: _____
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: INSUFICIENTES 119 COL. CENTRO SAHUAYO MICHOACÁN.
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: CP. 59000
 TELÉFONO: 353 536 6614 CORREO: alexamezcua@hotmail.com

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: RESIDENCIA PARTICULAR EN LA ZONA CENTRO DE SAHUAYO, MICH.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES OTRO _____

CONDICIONES PARA INGRESAR: DOMICILIO PARTICULAR. USAR 6:00AM

DOCUMENTOS: INE-Imss.

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 25 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: CABINA MEDIA

CLASIFICACIÓN	TIPO DE CABINA	
CARGA <input type="checkbox"/> CAMILLAS <input type="checkbox"/>	MEDIDA 1.10M <input checked="" type="checkbox"/>	ELEVACIÓN <u>3.35</u>
DISCAPACITADOS <input checked="" type="checkbox"/> TIJERAS <input type="checkbox"/>	SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) <input type="checkbox"/>	ESTACIONES <u>2</u>
AUTOS <input type="checkbox"/> UNDER RAMP <input type="checkbox"/>	COMPLETA 2.10M <input type="checkbox"/>	CAPACIDAD DE CARGA <u>500 kg</u>
		UNIDAD HIDRÁULICA <u>2 HP.</u>

DIMENSIÓN DE FOSO:

LARGO 1.75 ELEVADORES DE TIJERA, 45CM

ANCHO 1.50 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM

PROFUNDIDAD 0.20 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM

DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.30

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO

FOSO

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA

GUÍA MECÁNICA EN PROCESO.

SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA PARED

SI TUBERÍA DELGADA

NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA

ACCESORIOS EXTRAS COSTO

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

 NOMBRE Y FIRMA

 FECHA DE TÉRMINO

 FIRMA

COLORES ACABADO DE ELEVADOR

BLANCO SILVER METALLIC METAL DESPLEGADO CRISTAL

AZUL/GRIS PANTONE CÓDIGO _____ LÁMINA PINTOR CLARO

AZUL/BLANCO AUCOBOND COLOR OTRO _____ ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

APD JUAN A. BENITEZ CRUZ TECNORAMPA

Alejandro Amezcua Gb7 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

COT - 33667

8906

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: VIVIENDA PARTICULAR, INSTALACIÓN EN PATIO POSTERIOR, USAR TEMPRANO A LA OSGARMA ZONA CENTRO
AGREAR EN GUÍA MECÁNICA ESTRUCTURA DE PIR 4" x 4" CAL 7.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V

220 V



GENERADOR

- ACCESO NEUTRO.
- PUERTA DE 80cm

AGREAR ESTRUCTURA PIR 4" x 4" CAL 7

CABINA

← 1.30 →

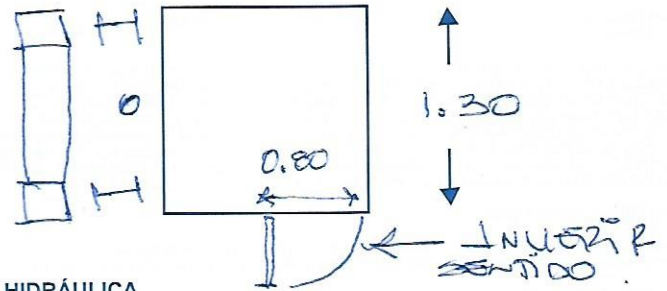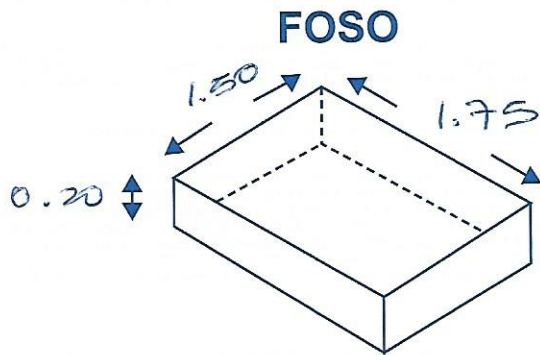

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS


PEDESTAL

SOBREPUESTAS

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3.0 mts

- EMPOTRADAS
- CANALIZADAS POR TECNORAMPA

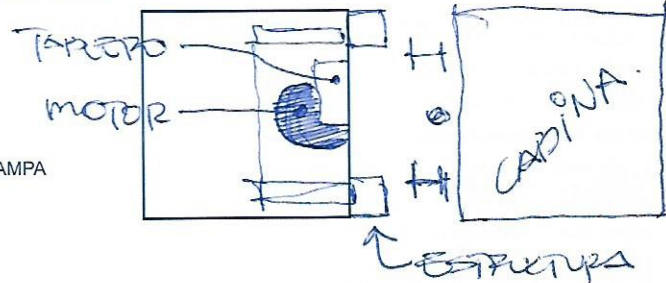

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDE RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

- Alejandro Amezcua Gutiérrez
- Francisco Amezcua Gutiérrez

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: Alejandro Amezcua Gutiérrez

TELÉFONO 1): 353 53 666/4

CONTACTO 2): _____

TELÉFONO 2): _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

APD José A. Pérez Cruz
TECNORAMPA

Alejandro Amezcua Gutiérrez
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
