

BLVD. HIDALGO #117-A, COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RÍO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionaclientes@tecnorampa.com.mx

# 23544

SUC 14413

NOMBRE DEL CLIENTE: RODIGO JESÚS PEDRONO GARCIA FECHA: 04-11-2022  
 RAZÓN SOCIAL: BACKER DEVELOPMENTS, SA DE CV  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: AV VILLA MANA SUR 570 FRACC VILLA MANA  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: 78413, SUR, SUR  
 TELÉFONO: 55 33681467 CORREO: rodigo@backer.mx

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: TRABAJOS DE REPARTAMIENTOS EN REPARTIDO  
ACCESOS RELATIVOS, TRABAJAR EQUIPO PARA MOSTR RAMPAS.

**EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL**

ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO  OTRO \_\_\_\_\_

CONDICIONES PARA INGRESAR: RAMPAS EMPINADAS HORARIO: 9:00 am a 6:00

DOCUMENTOS: IMSS - INE OTROS: \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 80 %

DESCRIPCIÓN DE EQUIPO: TR EVOLUTION

**TIPO DE RAMPA**

CLÁSICA COMPACTA   
 TR EVOLUTION   
 HEAVY DUTY

**DIMENSIONES DE PLATAFORMA**

1.90 X 3.75 M  2.00 X 3.75 M   
 2.10 X 3.75 M  1.90 X 3.50 M   
 2.00 X 3.50 M  2.10 X 3.50 M

**CONDICIONES**

LIBRE  ALTURA LIBRE 2.10  
 EMPATADAS  CAPACIDAD DE CARGA 7000 lbs  
 UNIDAD HIDRÁULICA 2H.

CARACTERÍSTICA ESPECIAL \_\_\_\_\_

CONDICIONES Y DIMENSIONES DE ACCESO ACCESO PRINCIPAL 2.30 ANCHO X 2.90 ALTO

**NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA**

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

**TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR**

CLIENTE:	SI	NO	TECNORAMPA
FIRME DE CONCRETO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GUÍA MECÁNICA <u>EN PROCESO</u> <input checked="" type="checkbox"/>
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SOLICITUDES ADICIONALES _____
ELEMENTOS ESPECIALES DE FIJACIÓN	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC   
 CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 110 VAC   
 CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALADA  NO INSTALADA  OTRO

ACCESORIOS EXTRAS COSTO \_\_\_\_\_

ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA \_\_\_\_\_

FECHA DE TÉRMINO \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

**ACABADO DEL ELEVADOR**

COLORES AZUL  GRIS  A PARTIR DE 10 EQUIPOS  
 PLATAFORMA  DE WINGO  
 COLUMNAS  \_\_\_\_\_  
 OTRO \_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES**


\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIÓN AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS. EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.


**NOTA:**  
REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:** *mapa posterior resultado 1. mty.*

**CROQUIS Y DIMENSIONES**

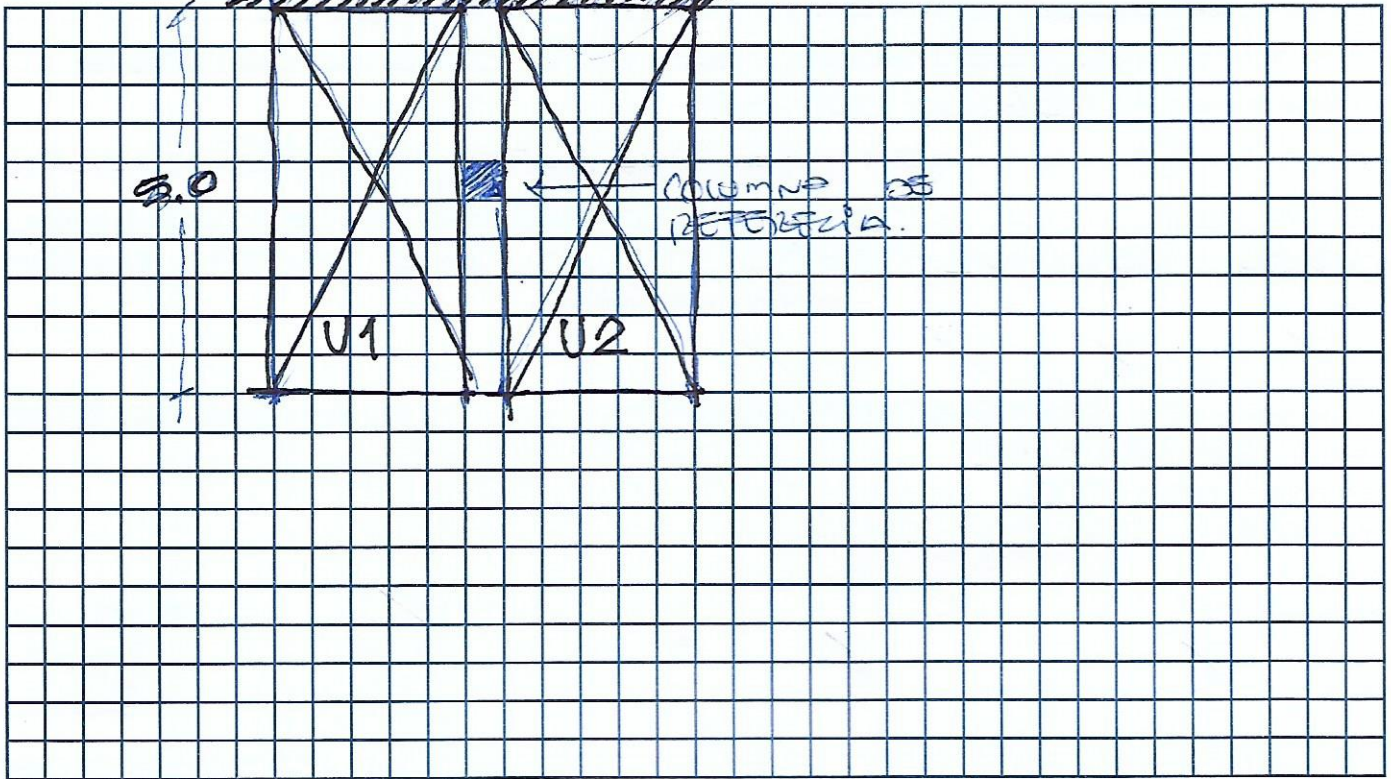

**CONEXIÓN UNIDAD HIDRÁULICA**

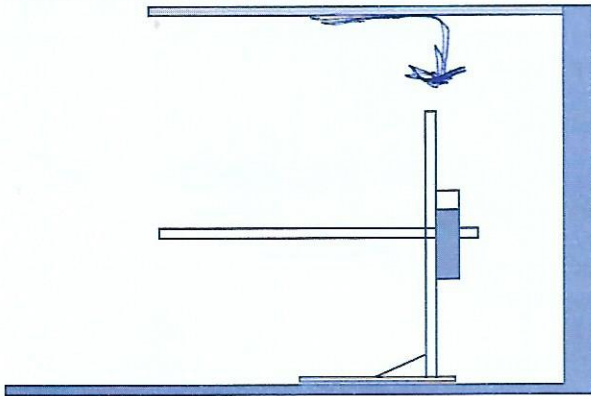

**UBICACIÓN**

- SOBRE PISO
- ÁREA
- EN MURO

**TIPO DE CONEXIÓN (RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE)**

- DISPARO ELÉCTRICO
- CLAVIJA MEDIO GIRO

DISTANCIA DE CABLE DE 4 X 12 *los 3 mts de línea.*

**EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO, LAS PERSONAS QUE PUEDEN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN SON:**

**NOTA:**  
PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES SEGÚN LA PROGRAMACIÓN EN ESE MOMENTO.

**NOMBRE** *Mayra Oviedo Loredó*

**FIRMA** *Mayra Oviedo Loredó*

**ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A INSTALAR**

*ARQ. Jesús A. Benítez Cruz*

**TECNORAMPA**

*Mayra Oviedo Loredó*

**NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE**
