

TecnoRampa

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO
C.R. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LEVANTAMIENTO DE ELEVADORES 6711

LADA SIN COSTO:
01 800 4330 332; 01 800 6380 850
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Ing. Andres Garcia Garcia FECHA: 28/Nov/17
 RAZÓN SOCIAL: Inmobiliaria Los Fortales del Rio Bravo
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CARRETERA MATAPUJOS-MATATZUM Km -9.9 Barrio 115 C.P. 28920
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Rio Bravo TAMP
 TELÉFONO: (956) 5925105 CORREO: pasiente@aol.com

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: _____

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO
COLUMNAS LARGAS CORTAS EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
No. PARTE: OTRO _____

CONDICIONES PARA INGRESAR: _____ HORARIO: _____

DOCUMENTOS: _____ OTROS _____

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: _____

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador de Carga Cap. 3000 Kg.

CLASIFICACIÓN CARGA CAMILLAS TIPO DE CABINA MEDIA 1.10 M
 DISCAPACITADOS TÍJERA SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) ELEVACIÓN: 5.00m 5.18 mts
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10 M ESTACIONES: 2
 CAPACIDAD DE CARGA: 3000 Kg.
 UNIDAD HIDRÁULICA: 10hp.

DIMENSIÓN DE FOSO:

LARGO 320

ANCHO 320

PROFUNDIDAD 0.60

SIN FOSO

ELEVADORES DE TÍJERA: 45 CM

ELEVADORES DE 2 COLUMNAS: 20 CM

ELEVADORES DE 4 COLUMNAS: 20 CM

DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 300 ANCHO 2.40

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJO PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE: SI NO
 FOSO SIN FOSO
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA
 GUÍA MECÁNICA
 SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA SI TUBERÍA PARED DELGADA
 NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA OTRO _____

ACCESORIOS EXTRAS COSTO

ACEPTO COSTO ADICIONAL _____

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA _____

NOMBRE Y FIRMA _____

FECHA DE TÉRMINO _____

FIRMA _____

ACABADO DEL ELEVADOR

COLORES

BLANCO SILVER METALLIC
 AZUL / GRIS PANTONE CÓDIGO: _____
 AZUL / BLANCO ALUCOBOND COLOR

METAL DESPLEGADO
 LÁMINA PINTO
 OTRO: _____

CRISTAL

CLARO
 TINTEX
 ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL: _____

Arq. Laura Vargas M.

Andres Garcia Garcia
 Dic. 8, 2017

6711


NOTA: SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIÓN AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA: REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: _____

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN


110 V 220V GENERADOR

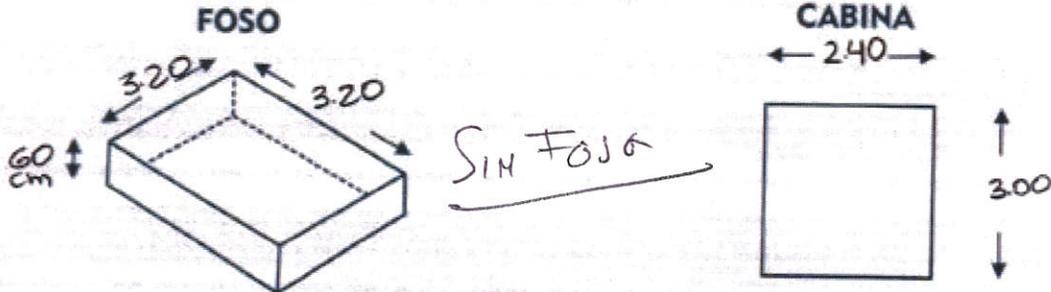

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

- PEDESTAL
- SOBREPUESTAS
- DISTANCIA APROXIMADA _____
- ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA _____
- EMPOTRADAS
- CANALIZADAS POR TECNORAMPA



EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON: _____

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRERA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: _____ FIRMA: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

[Handwritten signature]
 TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Dic. 8. 2012
[Handwritten signature]
 ANDRÉS GARCÍA GARCÍA
