

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
 TEC080710M22
 Tels: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecorampa.com.mx
 0142772728119
 LADA SIN COSTO:
 018006230332

EKT 3285 HUAUCHINANGO

NOMBRE DEL CLIENTE: GERARDO LOPEZ FECHA: 20/NOV/19
 RAZÓN SOCIAL: NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: RAFAEL CRAMOTO N°15 COL. CENTRO
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: HUAUCHINANGO, PUEBLA C.P. 73170
 1 CUADRA DE PARCOQUILA TELÉFONO: _____ CORREO: glopez@aci.com.mx
~~UTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN~~
 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: _____

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES OTRO ARNES Y LINEA DE VIDA

CONDICIONES PARA INGRESAR: _____
 DOCUMENTOS: IFE INE
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 75 %
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: _____

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
 CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10M ELEVACIÓN 4.11
 DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) ESTACIONES DOS
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10M CAPACIDAD DE CARGA 2000 KG
 UNIDAD HIDRÁULICA 10 H.P.

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
 LARGO 2.20 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ANCHO 2.80 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, ~~4.00~~ 0.60
 PROFUNDIDAD 0.61 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 2.0 ANCHO 2.01M

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA BOTONERAS CON DISPLAY Y PUERTAS EXTERIORES

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO TECNORAMPA
 FOSO GUÍA MECÁNICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA SOLICITUDES ADICIONALES _____
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA TUBERÍA PARED
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA SI TUBERÍA DELGADA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES CRISTAL
 BLANCO SILVER METALLIC METAL DESPLEGADO CLARO
 AZUL/GRIS PANTONE LÁMINA PINTOR TINTEX
 AZUL/BLANCO ALUCOFOND COLOR OTRO CAMUFLAJE PERFORADA ESMERILADO
 SOLICITUD ADICIONAL: NEGRAS CUADROS

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Alejandro Diaz G.
 TECNORAMPA

Gerardo Lopez
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA



REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

PENDIENTES PARA INGRESO A INSTALAR:

OBSERVACIONES GENERALES: CERRAR COMPLETAMENTE TECHOS EN AREA DEL MONTAJE CARGAS, C. CARGA CON ALIMENTACION TRIFASICA 220 V + NEUTRO + TIERRA FISICA CON PASTILLA 3X50 AMPS. BODEGA CERRADA DE RESGUARDO DE 2.00m x 2.00m FOSO SECO Y LIMPIO AREA DESPEJADA PARA DESCARGA E INSTALACION

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V 220 V GENERADOR

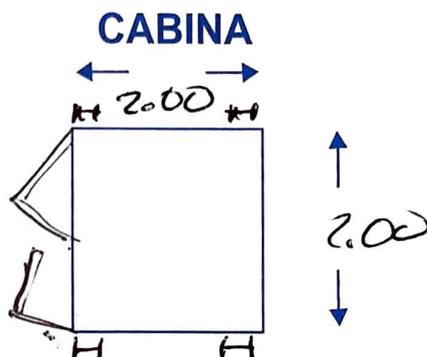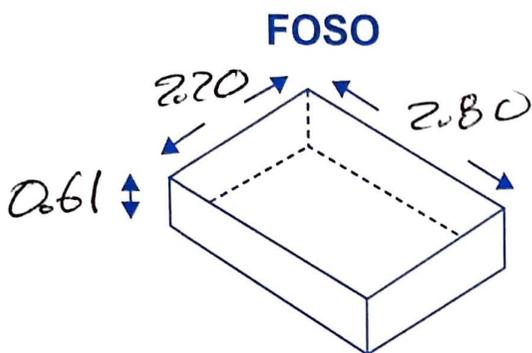

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS


PEDESTAL
SOBREPUESTAS

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 2.00

ACCESO

EMPOTRADAS
 CANALIZADAS POR TECNORAMPA



EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

ORLANDO MUÑOZ 7761019015

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: _____ TELÉFONO 1): _____
CONTACTO 2): _____ TELÉFONO 2): _____

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
