

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels. 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx  
 0142772728119  
 LADA SIN COSTO:  
 018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: NICANDRO ANLEHU FECHA: 4/DIC/19  
 RAZÓN SOCIAL: M.G. CONDOMINIOS SA. DE CV.  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: AV. CIRCUITO PUERTA DEL SOL, N° 327 colonia Ciudad  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: del Sol Delo Felipe Carrillo Puerto, Querétaro QRO.  
Libramiento Norponiente TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: nicandro@mg-arquitectos.com

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES  OTRO \_\_\_\_\_

CONDICIONES PARA INGRESAR: \_\_\_\_\_

DOCUMENTOS: IFE TIME

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 65 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: HANDICAP SENII

**CLASIFICACIÓN** TIPO DE CABINA

CARGA  CAMILLAS  MEDIDA 1.10M  ELEVACIÓN 3.40  
 DISCAPACITADOS  TIJERAS  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M)  ESTACIONES DOS  
 AUTOS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10M  CAPACIDAD DE CARGA 500 KG  
 UNIDAD HIDRÁULICA 3 HP

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM   
 LARGO 1.45 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ANCHO 1.50 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 PROFUNDIDAD 0.20 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.30 ANCHO 1.30

**NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA**

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

**TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:**

CLIENTE: SI NO TECNORAMPA

FOSO   GUÍA MECÁNICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA   SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_  
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA TUBERÍA PARED  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA SI  TUBERÍA  DELGADA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA NO  CANALETA  GRUESA

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALADA  NO INSTALADA  RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA  
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO  \_\_\_\_\_  
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

**ACABADO DE ELEVADOR**

COLORES CRISTAL

BLANCO  SILVER METALLIC  METAL DESPLEGADO  CLARO   
 AZUL/GRIS  FANTONE  LÁMINA PINTOR  TINTEX   
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR  OTRO \_\_\_\_\_ ESMERILADO   
 CÓDIGO DE LINEA

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

Alejandro Diaz Gonzalez ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICA Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR  
 TECNORAMPA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: CABINA CON PUERTA A DOS HOJAS  
REFUERZO DE SOPORTE EN MURO A 1.07 POR EL CLIENTE. SE SOLICITA  
BODEGA DE RESGUARDO SEGURA, SUMINISTRO DE ENERGIA CON CENTRO  
DE CARGA EN SITIO

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V       220 V       GENERADOR

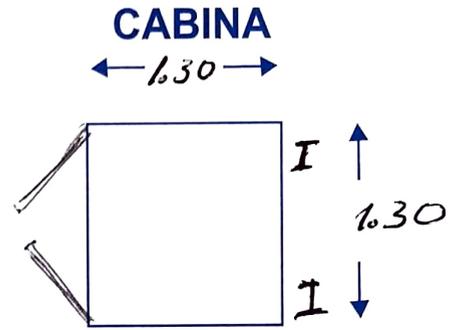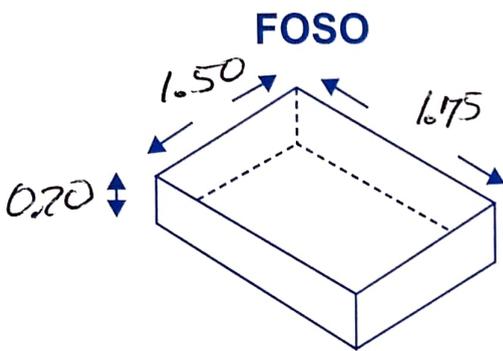


INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL   
SOBREPUESTAS

EMPOTRADAS  
 CANALIZADAS POR TECNORAMPA

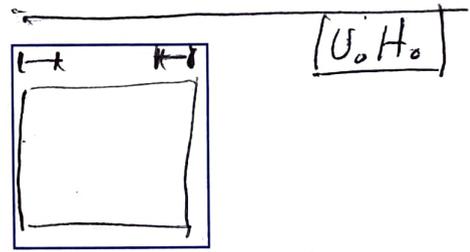

DISTANCIA APROXIMADA  
ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 2.00

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDE RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: \_\_\_\_\_ TELÉFONO 1): \_\_\_\_\_  
CONTACTO 2): \_\_\_\_\_ TELÉFONO 2): \_\_\_\_\_

Alejandro Díaz González  
TECNORAMPA

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

