

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
TEC080710M22
Tels. 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecorampa.com.mx
0142772728119
LADA SIN COSTO:
018006230332

EKT 1964 ECHEVESTE

NOMBRE DEL CLIENTE: ING. CÉSIA ZAMORA FECHA: 23/DIC/19
 RAZÓN SOCIAL: NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: BLVD MIGUEL HIDALGO S/N COLOMA ECHEVESTE
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: LEON GUANAJUATO CP. 37100
JUNTO A BODEGA ARRERA TELÉFONO: _____ CORREO: cezamora@consulpro.com.mx

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: _____

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES OTRO ARNES Y LINEA DEVIDA

CONDICIONES PARA INGRESAR: _____
DOCUMENTOS: IFE INE

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 70 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ELEVADOR DE CARGA DE 2000 KG

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
 CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10M ELEVACIÓN 4.54 m
 DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) ESTACIONES DOS
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10M CAPACIDAD DE CARGA 2000 KG
 UNIDAD HIDRÁULICA 10 HP

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
 LARGO 2.20 m ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ANCHO 2.80 m ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, ~~2.10~~ 0.60
 PROFUNDIDAD 0.60 m DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 200 ANCHO 200

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA BOTONERAS CON DISPLAY Y PUERTAS EXTERIORES

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO TECNORAMPA
 FOSO GUÍA MECÁNICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA SOLICITUDES ADICIONALES _____
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA TUBERÍA PARED
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA SI TUBERÍA DELGADA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

EMANUEL ROSAS

 NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES BLANCO SILVER METALLIC METAL DESPLEGADO CRISTAL CLARO
 AZUL/GRIS PANTONE LÁMINA PINTOR TINTEX
 AZUL/BLANCO MUCOBOND COLOR OTRO LÁMINA PERFORADA ESMERILADO
 SOLICITUD ADICIONAL: NEGRO CROMADO

Alejandro Diaz G. ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
 TECNORAMPA Ing. Cesia Zamora Supervisión Consulpro
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA



REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

PENDIENTES PARA INGRESO TRIFASICA 220 VOLTS
C. CARGA CON TERMOMAGNETICA 3X50 AMPS + NEUTRO + TIERRA

OBSERVACIONES GENERALES: EN AREA DE UNIDAD HIDRAULICA, BODEGA DE RESGUARDO DE MATERIALES O EQUIPOS CON PUERTA, ENERGIA INTERRUMPIDA DURANTE LA INSTALACION LIMPIEZA DE FOSO, AREA DESPEJADA PARA INGRESO

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V 220 V GENERADOR

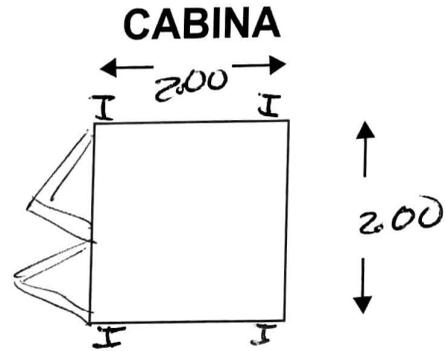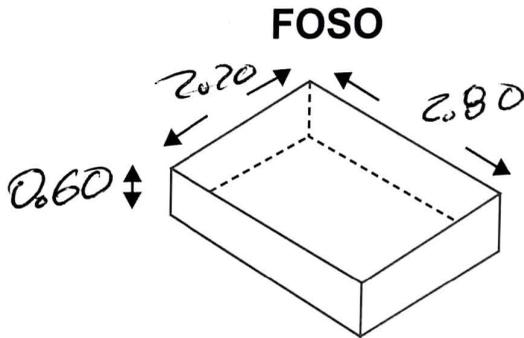

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA


BOTONERAS

PEDESTAL
SOBREPUESTAS

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 200

EMPOTRADAS
 CANALIZADAS POR TECNORAMPA



EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

ING. ESMERALDA MARTINEZ

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: _____ TELÉFONO 1): _____
CONTACTO 2): _____ TELÉFONO 2): _____

ALEJANDRO DIAZ G.
TECNORAMPA

Ing. Cecilia Zamora
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
