

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.:(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecorampa.com.mx  
 4272728119  
 LADA SIN COSTO:  
 800 623 0332

**Nº 20345**

NOMBRE DEL CLIENTE: Juan Pablo Colín FECHA: 24-11-22  
 RAZÓN SOCIAL: 28110-20417  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PRIV. MILANO #2 COL. SAN MARTIN.  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Ameqlico 9to  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO   
 EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES  OTRO \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES PARA INGRESAR: IMSS, INE  
 DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_  
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 50 %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: \_\_\_\_\_

**CLASIFICACIÓN** **TIPO DE CABINA**  
 CARGA  CAMILLAS  MEDIDA 1.10 M  ELEVACIÓN 2.16  
 DISCAPACITADOS  TIJERAS  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)  ESTACIONES 2  
 AUTOS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10 M  CAPACIDAD DE CARGA 1.500 KG  
 UNIDAD HIDRÁULICA 10# P

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 LARGO 2.00 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ANCHO 260 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 PROFUNDIDAD 0.60 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.80 ANCHO 1.80

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM<sup>2</sup>. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

**TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:**

CLIENTE: SI NO **TECNORAMPA**  
 FOSO   GUÍA MECÁNICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA   SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_  
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA **TUBERÍA** **PARED**  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA SI  TUBERÍA  DELGADA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA NO  CANALETA  GRUESA

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTOS   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_

**RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA**

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

**ACABADO DE ELEVADOR**

**COLORES** **CRISTAL**  
 BLANCO  SILVER METALLIC  METAL DESPLEGADO  CLARO   
 AZUL/GRIS  PANTONE  LÁMINA PINTOR  TINTEX   
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR  OTRO  ESMERILADO   
 SOLICITUD ADICIONAL: Código Negro TR  
Lamina Rescorada

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Jorge Salvador Silva  
 TECNORAMPA

[Firma]  
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE



NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: Solo corriente 220V. bifásica  
Ligje soto en edificio existente a Recorrido  
con botonera en interior y exterior tipo  
carga / piso de cabina con lamina lisa

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN



Revisar electrico iman en Puertas del elevados

110 V


220 V

GENERADOR

FOSO

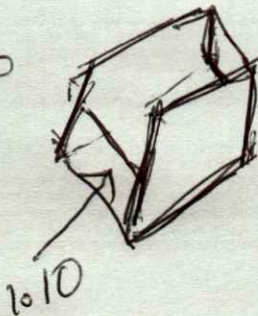
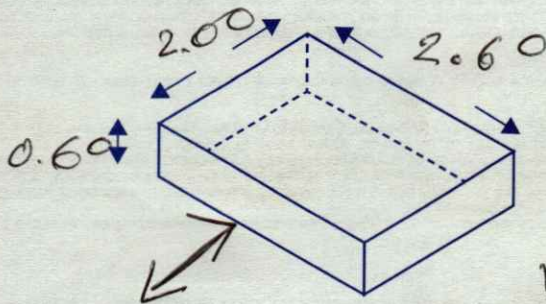


CABINA

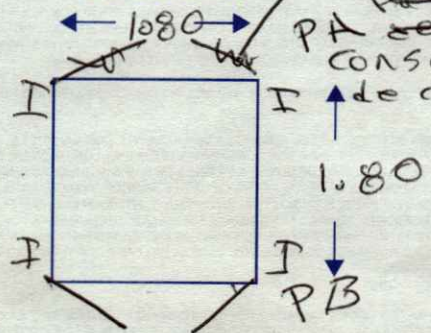

Revisar Puertade electrica para puerta PA de cabina. Consensor de cortina

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

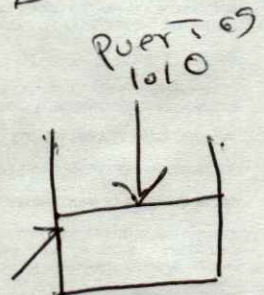

BOTONERAS

PEDESTAL

SOBREPUESTAS

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3mts.

EMPOTRADAS

CANALIZADAS POR TECNORAMPA

Laterales 2.10 mt.

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: \_\_\_\_\_ TELÉFONO 1): \_\_\_\_\_

CONTACTO 2): \_\_\_\_\_ TELÉFONO 2): \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Arq. Salvador Silva S.  
TECNORAMPA

[Signature]  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
