



CLIENTE: <u>ARQ LAURA BARRAS</u>										# <u>24249</u>	
RAZÓN SOCIAL: <u>BOJICA CONSTRUCCION S DE RL DE CV</u>										<u>15283</u>	
TEL: <u>777 370 2680</u>					CORREO: <u>laurabarras@gmail.com</u>						
DIRECCIÓN: <u>CARRETERA MEXICO CUAUTLA KM 98.2 Tm COL MINER HIDALGO, CUAUTLA MOR.</u>											
Accesibilidad a la zona de trabajo: <u>HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA MORELOS. EN FUNCION.</u>											
Requerimientos especiales: <u>AVISAR DE LA USURA DE LA UNIDAD. PARA CIERRE DE CAUSE.</u>											
Reglamento de ingreso:		<u>ACCESO POR URGENCIAS / CURPEDIOS.</u>						Horario:		<u>8:00 a 6:00 pm</u>	
Documentos:		<u>DNE / DMS</u>						Otros:			
Equipo a suministrar:		Rampa		Elevador		<input checked="" type="checkbox"/>		Cantidad		<u>1</u>	
								Cap. Carga		<u>1000kg</u>	
Equipo Especial		<u>ELEVADOR COMPLETO CON PUERTAS AUTOMATICAS.</u>									
RAMPA CARACTERÍSTICAS						ELEVADOR CARACTERÍSTICAS					
PARKING LIFT		ALT ELEVACIÓN		ANDÉN		CLASIFICACIÓN		TIPO DE CABINA		APERTURA	
TR EVOLUTION				NIV HIDRA / HD		CARGA		MED / SEMI		90	
HEAVY DUTY		H. LIBRE		NIV MECÁNICA		DISCA		CREW V1/V2		ESTACIONES <u>2</u>	
TR ONE				RHINO TI / TI HD		AUTOS		FULL VOX / VOX EVO		ALT ELEVACIÓN <u>4.75</u>	
DIMENSIONES DE PLATAFORMA				TALLER		CAMILLAS		VOX PLATAFORMA		DIMENSIONES CABINA INTERIOR	
1.9 X 3.75		2.00 X 3.75		2 POST / HD		<input checked="" type="checkbox"/>				<p>L= <u>2.40</u> A= <u>1.60</u></p>	
2.10 X 3.75		1.90 X 3.50		PORTERIA		TIJERAS		FOSO			
2.00 X 3.50		2.1 X 3.50		FRENERA		UNDERRAMP		0.2 0.3 0.45 0.6			
						ESPECIAL		L= <u>2.95</u> A= <u>2.30</u> P=			
Características especiales: _____											
Condiciones y dimensiones de acceso: _____											
Requerimiento estructural (Firme o foso): <u>Firme de concreto de 15 cm de espesor con resistencia de 250Kg/cm2. con malla electrosoldada 6/6,10-10</u>											
Componentes Adicionales: _____											
TRABAJOS A REALIZAR											
CLIENTE				SI		NO		TECNO RAMPA			
FIRME				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		GUÍA MECÁNICA <u>EN PROCESO.</u>			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:						<input checked="" type="checkbox"/>		SOLICITUDES ADICIONALES _____			
ELEMENTOS DE FIJACIÓN:						<input checked="" type="checkbox"/>		_____			
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA											
UNIDAD HIDRÁULICA		2		3		5		10		15	
										20	
										ESP- <u>4.2</u> HP	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFASICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA						INSTALADA		<input checked="" type="checkbox"/>		NO INSTALADA	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NETURO Y TIERRA FÍSICA						TIPO		TUBERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NUETRO Y TIERRA FÍSICA						ESPESOR		DELGADA		<input checked="" type="checkbox"/>	
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:						<u>BOTONERAS CON DISPLAY EXTERIOR E INTERIOR.</u>					
ACEPTO COSTO ADICIONAL (NOMBRE Y FIRMA): _____											
RESPONSABLE OBRA ELÉCTRICA (NOMBRE Y FIRMA) : _____											
ACABADOS RAMPAS / ELEVADORES											
PINTURA				PINTURA				PAREDES INTERIORES		CRISTAL	
COLORES DE LINEA		ROJO		GRIS		NEGRO		DE LÍNEA		BLANCO	
										CROMO	
PLATAFORMA						Cod.		SILVER MENT		COLOR ESPECIAL	
COLUMNAS						Cod.		NEGRO		Cod.	
										ALUCOBOND	
										METAL DESPLAGADO	
										LAMINA PERFORADA	
										CLARO	
										TINTEX	
										ESMERILADO	
SOLICITUD ADICIONAL: <u>ACABADOS CONFIRMADOS POR PROYECTOS. Y CORREO.</u>											
ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR											

ARQ JESUS A. BENITEZ
TECNORAMPA

Laura Barras
LAURA BARRAS SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE

NOTA: SE PODRÁN INSTALAR CONTROLADORES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.


NOTA: REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE. 24245 / 15283.

Observaciones generales EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN PORO EN OPERACIÓN.
TRASER MATERIAL PARA PROTECTOR ACABADOS

DETALLE GRÁFICO


- DETALLE DE ESPACIOS EN PLANO
- PASO DE 3" Ø DE FOSO A REGISTRO EN CTO DE MAQUINAS.
- REGISTRO DE 0.25 x 0.40 MTS.
- LINEA DE COLUMNAS A CONCRETO ARMADO.
- CON PANTA UA. DE PUBLICIDAD
- POR REQUERIMIENTO DE SECTOR SOND LAS PUERTAS DEBEN ABRIR MÍNIMO 1.20 DE ANCHO.
- ANCHO LIBRE DE UNIDAD 2.30 INT.

ELEVADORES / RAMPAS NIVELADORAS FOSO



CABINA	APERTURA:
TIPO DE PTA: CABINA	ARMADA <input checked="" type="checkbox"/> DESARMADA <input type="checkbox"/>

↳ Autómata

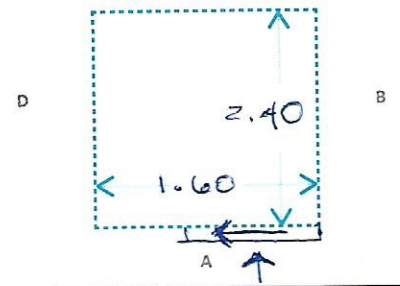

ISOMÉTRICO CRISTALES	TIPO DE ANCLAJE
	ESTRUCTURA <input checked="" type="checkbox"/>
	CADENAS <input type="checkbox"/>
	PLACA <input type="checkbox"/>
	PLACA CON ESPARRAGOS <input type="checkbox"/>

NOTA: ESPECIFICAR APERTURA DE PUERTAS EN ELEVADOR, ESQUEMA DE TRAYECTORIA DE CONEXIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA.

ACCESOS POR NIVEL		GRÁFICA DE NIVELES
		ESPEJOR
		H:
		ESPEJOR
		H:
		ESPEJOR
		H:
N →	↑	ESPEJOR
		H: <u>4.75</u>
N →	↓	ESPEJOR
		H:

ISOMÉTRICO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA	RAMPA	ELEVADOR
	ÁREA	TIPO DE CONEXIÓN
	MURO	DISPARO
	PISO	CLAVIA (Por Cliente)
	DIST. DE CABLE 4 X 12	
	EXTRAS: <u>CONTEMPLAR MANGUERA HIDRÁULICA PARA LA UNIDAD. (8.00 mts).</u>	
		BOTONERAS
		PEDESTAL
		CANALIZADA POR TECNORAMPA <input checked="" type="checkbox"/>
		SOBREPUESTA
		EMPOTRADAS
		EMPOTRADAS
		ELECTRO IMANES

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y LA ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONA ASIGNADA PARA RECEPCIÓN DEL EQUIPO:	1- <u>DR. LAURA BARAJAS</u>	TEL: <u>777 370 2680</u>
2-		TEL:

APQ JESICA BENITEZ
 TECNORAMPA

Laura Barajas
 NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE
 LAURA BARAJAS SANDOVAL
