

NOMBRE DEL CLIENTE: Arq. Moises Eloy Flores Villalva FECHA: 18/Mayo/2018
 RAZÓN SOCIAL: Elektra del Milenio / Merida
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Plaza AKropolis, Calle 61 # 400 x 63
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Col. Fraccionamiento los Americanos, Merida
Yucatan. TELÉFONO: 3310161796 CORREO: 6ktplazaakropolismerida@

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Acceso por puerta principal, entraríamos
antes de que coloquen anaquelos.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 COLUMNAS LARGAS CORTAS *dejar al cliente ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES OTRO -

CONDICIONES PARA INGRESAR: espacio para dejar paso a columnas. HORARIO: Hora libre.

DOCUMENTOS: Gafoto de compañía. OTROS -

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 15 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador de carga con todos nuevos modelos.

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA ELEVACIÓN 4.55m.
 CARGA CAMILLAS MEDIA 1.10 M
 DISCAPACITADOS TIJERA SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10 M
 ESTACIONES 2 est
 CAPACIDAD DE CARGA 2000Kg
 UNIDAD HIDRÁULICA 10 Hp.

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM
 LARGO 2.20m ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ANCHO 2.80m ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 20 CM
 PROFUNDIDAD 0.60m DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 2.00m ANCHO 2.00m

*Act. de 0.80m se pide respetar 0.60m

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA Incluye puertas exteriores en cada nivel, botoneras
con display en cada estación. TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE: SI NO
 FOSO
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA
 GUÍA MECÁNICA
 SOLICITUDES ADICIONALES N/A

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA PARED
 SI TUBERÍA DELGADA
 NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 INSTALADA NO INSTALADA OTRO

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL

20/Junio/2018
 FECHA DE TÉRMINO

NOMBRE Y FIRMA

FIRMA

ACABADO DEL ELEVADOR

COLORES ACABADO DEL ELEVADOR CRISTAL
 BLANCO SILVER METALLIC METAL DESPLEGADO
 AZUL / GRIS PANTONE CÓDIGO Negro LÁMINA PINTRO
 AZUL / BLANCO ALUCOBOND COLOR con crema OTRO Lamina
colores de linea. porforado.
 SOLICITUD ADICIONAL: TINTEX
 ESMERILADO

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Arq. Mariana Olvera
 TECNORAMPA

Arq. Moisés Eloy Flores Villalva
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA:

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA:


REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES:

*- Queda pendiente al momento de la visita.
* Ajustar foso a 60 cm, * Levantar estructura * Alimentación eléctrica para motor. * Area corrida y limpia.*

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V 220V GENERADOR

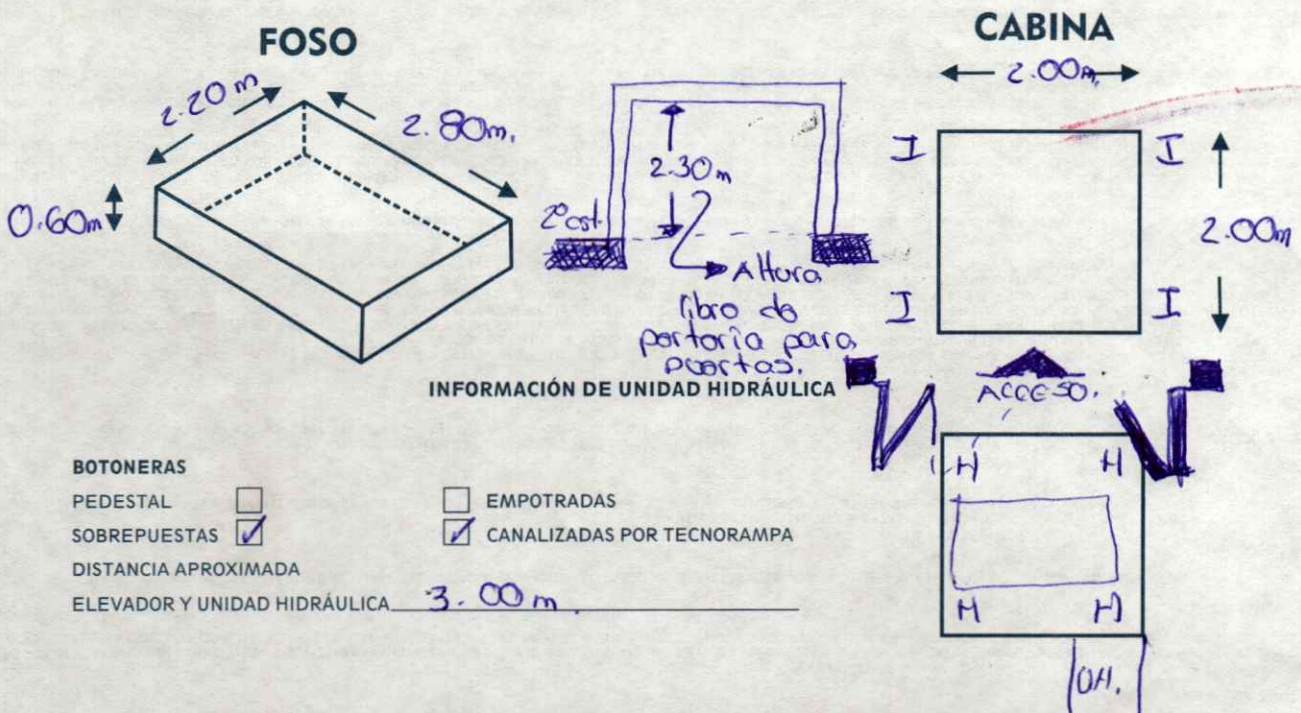

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Asa Mariana Ojeda
TECNORAMPA

Ing. Moisés Eloy Flores Villalva
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
