


 CLIENTE: APD PABLO MERINO - APD NAYELI CANO # 28220

 RAZÓN SOCIAL: LEMA EDIFICACIONES

 TEL: 442 1832938 CORREO: arg.cano@outlook.com

DIRECCIÓN:

 Accesibilidad a la zona de trabajo: TEMPO JUAREZ. ATOLITO. - CENTRO DE 9TO 5TO.
DESCUARGA DESPUES DE 11:00 PM

Requerimientos especiales:

Reglamento de ingreso:

 Documentos: INE / dms /

 Equipo a suministrar: Rampa Elevador Cantidad T Cap. Carga 500kg U. Hidraulica 7.2 HP

 Equipo Especial: FOR RECOPRIDO. 13.20.

RAMPA CARACTERÍSTICAS				ELEVADOR CARACTERÍSTICAS							
PARKING LIFT	ALT ELEVACIÓN		ANDÉN	CLASIFICACIÓN		TIPO DE CABINA		APERTURA	N	90	180
TR EVOLUTION			NIV HIDRA / HD	CARGA		MED / SEMI		ESTACIONES	7		
HEAVY DUTY	H. LIBRE		NIV MECÁNICA	DISCA		CREW V1/V2		ALT ELEVACIÓN	13.20		
TR ONE			RHINO TI / TI HD	AUTOS		FULL VOX / VOX EVO		DIMENSIONES CABINA INTERIOR			
DIMENSIONES DE PLATAFORMA			TALLER	CAMILLAS		VOX PLATAFORMA					
1.9 X 3.75	2.00 X 3.75		2 POST / HD	TIJERAS		FOSO					
2.10 X 3.75	1.90 X 3.50		PORTERIA	UNDERRAMP		0.2	0.3	0.45	0.6		
2.00 X 3.50	2.1 X 3.50		FRENERA	ESPECIAL		L=	A=	P=	L=	A=	

Características especiales:

Condicionantes y dimensiones de acceso:

 Requerimiento estructural (Firme o foso): Firme de concreto de 15 cm de espesor con resistencia de 250Kg/cm2. con malla electrosoldada 6/6,10-10

Componentes Adicionales:

TRABAJOS A REALIZAR

CLIENTE		SI	NO	TECNO RAMPA	
FIRME	FOSO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GUÍA MECÁNICA	<u>EN PROCESO</u>
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:			<input checked="" type="checkbox"/>	SOLICITUDES ADICIONALES	
ELEMENTOS DE FIJACIÓN:			<input checked="" type="checkbox"/>		

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

UNIDAD HIDRÁULICA	2	3	5	10	15	20	ESP 4.2 HP	ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFASICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA								INSTALADA	NO INSTALADA	ACCESORIO EXTRA	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NETURO Y TIERRA FÍSICA								TIPO	TUBERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	CANALETA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NUETRO Y TIERRA FÍSICA							<input checked="" type="checkbox"/>	ESPESOR	DELGADA		GRUESA

 CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: CONDICIONADA POR TECNO RAMPA.

ACEPTO COSTO ADICIONAL (NOMBRE Y FIRMA):

RESPONSABLE OBRA ELÉCTRICA (NOMBRE Y FIRMA):

ACABADOS RAMPAS / ELEVADORES

PINTURA				PINTURA				PAREDES INTERIORES		CRISTAL	
COLORES DE LINEA	ROJO	GRIS	NEGRO	DE LÍNEA	BLANCO	CROMO		ALUCOBOND		CLARO	
PLATAFORMA				Cod.	SILVER MENT	<input checked="" type="checkbox"/>	COLOR ESPECIAL	METAL DESPLAGADO		TINTEX	
COLUMNAS				Cod.	NEGRO	<input checked="" type="checkbox"/>	Cod.	LAMINA PERFORADA		ESMERILADO	<input checked="" type="checkbox"/>

SOLICITUD ADICIONAL:

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

APD JESUS A. BENITEZ
TECNORAMPA

J. PABLO MERINO GUEZ
NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE

NOTA: SE PODRÁN INSTALAR CONTROLADORES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.




NOTA: REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE. 28220.

Observaciones generales - **OBRA EN ESTADO AVANZADO**
TIENER MATERIA PARA PROTECCIÓN DE BARRIOS
PARA SACARLO DE MATERIA Y EQUIPO.

DETALLE GRÁFICO

- SE MANDARON DISEÑOS POR CORREO DE PLANOS.
- REVISAR ENVÍO DE PISTÓN RELATIVO A LA INST. POR DIMENSIONES DEL MISMO.
- OBRA EN EL MISMO CENTRO DE STO CAPITAL.

ELEVADORES / RAMPAS NIVELADORAS FOSO

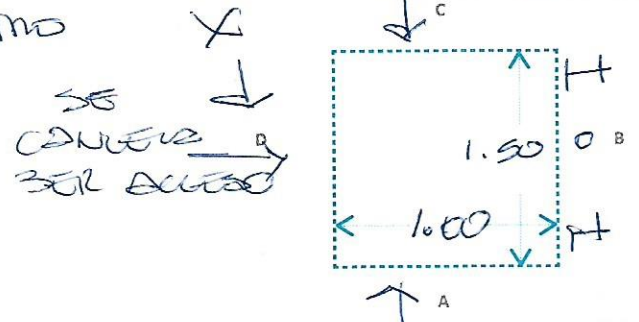

ISOMÉTRICO CRISTALES	TIPO DE ANCLAJE
	ESTRUCTURA <input checked="" type="checkbox"/>
	CADENAS <input type="checkbox"/>
	PLACA <input type="checkbox"/>
	PLACA CON ESPARRAGOS <input type="checkbox"/>

ACCESOS POR NIVEL	GRÁFICA DE NIVELES
	ESPESOR
	H:
	ESPESOR
	H:
	ESPESOR
	H:
	ESPESOR
	H:
	ESPESOR
	H:

NOTA: ESPECIFICAR APERTURA DE PUERTAS EN ELEVADOR, ESQUEMA DE TRAYECTORIA DE CONEXIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA.

ISOMÉTRICO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA	RAMPA	ELEVADOR																
	<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>TIPO DE CONEXIÓN</td> </tr> <tr> <td>MURO</td> <td>DISPARO</td> </tr> <tr> <td>PISO</td> <td>CLAVIA (Por Cliente)</td> </tr> <tr> <td>DIST. DE CABLE 4 X 12</td> <td></td> </tr> </table>	ÁREA	TIPO DE CONEXIÓN	MURO	DISPARO	PISO	CLAVIA (Por Cliente)	DIST. DE CABLE 4 X 12		<table border="1"> <tr> <td>PEDESTAL</td> <td>BOTONERAS</td> </tr> <tr> <td>SOBREPUESTA</td> <td>CANALIZADA POR TECNORAMPA <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>EMPOTRADAS</td> <td>EMPOTRADAS</td> </tr> <tr> <td>EMPOTRADAS</td> <td>ELECTRO IMANES</td> </tr> </table>	PEDESTAL	BOTONERAS	SOBREPUESTA	CANALIZADA POR TECNORAMPA <input checked="" type="checkbox"/>	EMPOTRADAS	EMPOTRADAS	EMPOTRADAS	ELECTRO IMANES
ÁREA	TIPO DE CONEXIÓN																	
MURO	DISPARO																	
PISO	CLAVIA (Por Cliente)																	
DIST. DE CABLE 4 X 12																		
PEDESTAL	BOTONERAS																	
SOBREPUESTA	CANALIZADA POR TECNORAMPA <input checked="" type="checkbox"/>																	
EMPOTRADAS	EMPOTRADAS																	
EMPOTRADAS	ELECTRO IMANES																	
EXTRAS:																		

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y LA ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONA ASIGNADA PARA RECEPCIÓN DEL EQUIPO:	1- ARQ PABLO MERINO	TEL: 461 198 69 88
	2- INGA ALEXANDER DÍAZ	TEL: 962 630 3390

ARQ JESÚS BENÍTEZ
TECNORAMPA

PABLO MERINO GUEZ
NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE
