

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.:(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx  
 4272728119  
 LADA SIN COSTO:  
 800 623 0332

Nº 20202

NOMBRE DEL CLIENTE: JAVIER BALLESTEROS FECHA: 14-07-2021  
 RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA DIVERTEU  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: CHUETERA NVA XAL - COA KM 0 + 100  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: ESD CARRETERA BRIONE COSTEPEC ZCENTRO  
COATEPEC, VZL 01500 TELÉFONO: 2288240918 CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: REVISAR HORARIO DE INGRESO DEL CAMIÓN // DEL EST AL LUGAR DE INSTALACIÓN SON 15 MTS.

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES 1 OTRO \_\_\_\_\_

CONDICIONES PARA INGRESAR: ES UN CENTRO COMERCIAL. SIN PROBLEMAS.

DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 80 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: HANDICAP CABINA SEMI COMPLETA.

<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>TIPO DE CABINA</b>		
CARGA <input type="checkbox"/> CAMILLAS <input type="checkbox"/>	MEDIDA 1.10 M <input type="checkbox"/>	ELEVACIÓN <u>4.15</u>	
DISCAPACITADOS <input checked="" type="checkbox"/> TIJERAS <input type="checkbox"/>	SEMI COMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) <input checked="" type="checkbox"/>	ESTACIONES <u>2</u>	
AUTOS <input type="checkbox"/> UNDER RAMP <input type="checkbox"/>	COMPLETA 2.10 M <input type="checkbox"/>	CAPACIDAD DE CARGA <u>500 KG</u>	
		UNIDAD HIDRÁULICA <u>2 HP.</u>	

DIMENSIÓN DE FOSO:

LARGO <u>2.10</u>	ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM <input type="checkbox"/>
ANCHO <u>2.00</u>	ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM <input checked="" type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD <u>.20</u>	ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM <input type="checkbox"/> <u>1.30</u>
	DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO <u>1.30</u> ANCHO <u>1.30</u>

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM². ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

**TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:**

<b>CLIENTE:</b>	SI NO	<b>TECNORAMPA</b>
FOSO	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	GUÍA MECÁNICA <input checked="" type="checkbox"/>
INSTALACIÓN ELÉCTRICA	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	SOLICITUDES ADICIONALES _____
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA <input checked="" type="checkbox"/>	<b>TUBERÍA</b>	<b>PARED</b>
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA	SI <input checked="" type="checkbox"/> TUBERÍA <input checked="" type="checkbox"/> DELGADA <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> CANALETA <input type="checkbox"/> GRUESA <input checked="" type="checkbox"/>
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA		

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTOS   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_

**RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA**

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

**ACABADO DE ELEVADOR**

<b>COLORES</b>	<b>NEURO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>CRISTAL</b>
BLANCO <input type="checkbox"/> SILVER METALLIC <input type="checkbox"/>	METAL DESPLEGADO <input type="checkbox"/>	CLARO <input checked="" type="checkbox"/> <u>SOLO PUERTA</u>
AZUL/GRIS <input type="checkbox"/> PANTONE <input type="checkbox"/>	LÁMINA PINTOR <input type="checkbox"/>	TINTEX <input type="checkbox"/>
AZUL/BLANCO <input type="checkbox"/> ALUCOBOND COLOR <input type="checkbox"/>	OTRO _____	ESMERILADO <input checked="" type="checkbox"/> <u>3 PAREDES.</u>

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

APB JUAN ANTONIO BARRERA JAVIER BALLESTEROS  
 TECNORAMPA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.



OBSERVACIONES GENERALES: El cliente pedirá los espacios de acceso de el camion de TECNORAMPA.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V  220 V  GENERADOR


0 TRAZO PASTUSA.

NO CONEXIONES DIRECTAS. CON CABLES.

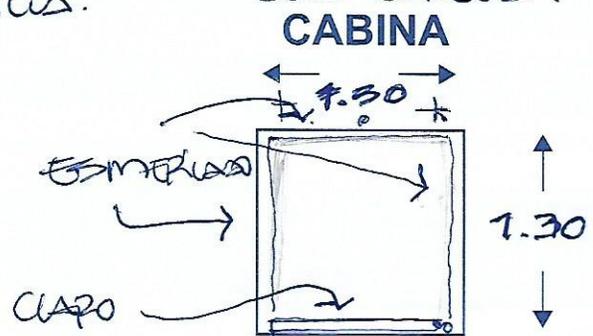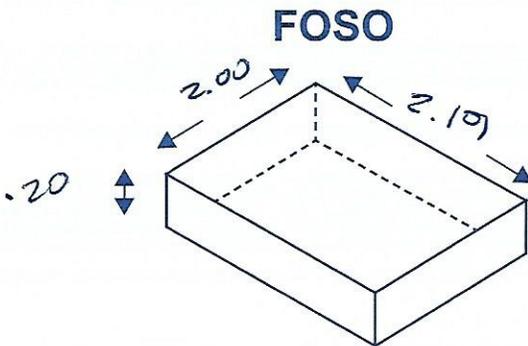

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

TABLERO  
LAS DEJAS EN EMPOTR.  
TABLAS ROCA.  
 EMPOTRADAS  
 CANALIZADAS POR TECNORAMPA



BOTONERAS

PEDESTAL   
SOBREPUESTAS   
DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 2 HP.

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: MARIBEL TELÉFONO 1): \_\_\_\_\_  
CONTACTO 2): 8281073874 TELÉFONO 2): \_\_\_\_\_

[Signature]  
A. BONIBZ.  
TECNORAMPA

[Signature]  
SAUER BALLESTEROS  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
