

**TecnoRampa**

**LEVANTAMIENTO DE ELEVADORES**

6890

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 4330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

13358

NOMBRE DEL CLIENTE: Arg. Carlos Meza FECHA: 30-08-17  
 RAZÓN SOCIAL: Carlos Ignacio Meza  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Manuel Lopez Cotilla #1053 Col.  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: del Valle CDMX  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_  
 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Edificio Deptos

TIPO DE EQUIPO: DESARMADO  ARMADO   
 DIMENSIONES: LARGAS  CORTAS   
 EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL: ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 CONDICIONES PARA INGRESAR: Reportarse con Pasabite OTRO: \_\_\_\_\_ HORARIO: 8:00 - 6:00pm  
 ELEMENTOS: \_\_\_\_\_ OTROS: \_\_\_\_\_  
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 80%  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Elevador de plataforma - Zaccos

CLASIFICACIÓN: TIPO DE CABINA: MEDIA 1.10 M   
 CAPACITADOS  TIJERA  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)   
 OTROS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10 M   
 ELEVACIÓN: 3.06  
 ESTACIONES: 2 estaciones  
 CAPACIDAD DE CARGA: 3,500  
 UNIDAD HIDRÁULICA: 10  
 EXTENSIÓN DE FOSO: \_\_\_\_\_  
 ANCHO: 5.86  
 ALTO: 3.17  
 PROFUNDIDAD: 0.45  
 ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR: LARGO 5.66 ANCHO 2.47

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA: \_\_\_\_\_  
 TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:  
 GUÍA MECÁNICA  TECNORAMPA  
 SOLICITUDES ADICIONALES: \_\_\_\_\_

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:  
 TUBERÍA: SI  TUBERÍA  PARED DELGADA   
 NO  CANALETA  PARED GRUESA   
 RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA: \_\_\_\_\_

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
 MODO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: INSTALADA  NO INSTALADA  OTRO   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO: \_\_\_\_\_  
 PUNTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE Y FIRMA: \_\_\_\_\_ FECHA DE TÉRMINO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

ACABADO DEL ELEVADOR: METAL DESPLEGADO  CRISTAL CLARO   
 COLOR: ANCO  SILVER METALLIC  LÁMINA PINTRO  TINTEX   
 AZUL / GRIS  PANTONE  OTRO: \_\_\_\_\_ ESMERILADO   
 AZUL / BLANCO  LUCOBOND COLOR   
 OPCIÓN ADICIONAL: Color de línea

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE



NOTA:  
SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO.  
PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERA BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGUN RECLAMO FUTURO.

NOTA:  
REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGUN RECLAMO O CONDICIÓN DE PRESIÓN A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**

110 V  220V  GENERADOR

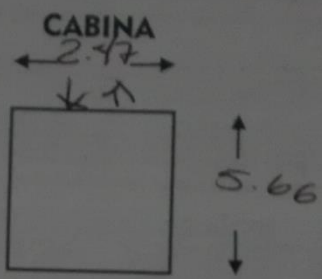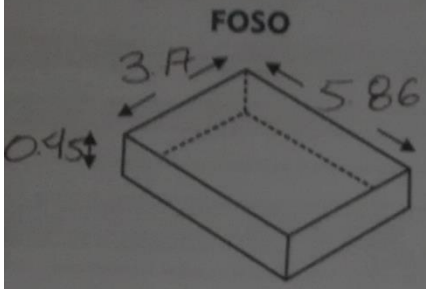

**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA**

**BOTONERAS**  
PEDESTAL  EMPOTRADAS   
SOBREPUESTAS  CANALIZADAS POR TECNORAMPA   
DISTANCIA APROXIMADA \_\_\_\_\_  
ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA \_\_\_\_\_

U.H. 2mts



EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:  
PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO.  
FIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA \_\_\_\_\_ NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE \_\_\_\_\_
