



CLIENTE: Farmacia San Pablo - Arq Eric Villalón * 13480
 RAZÓN SOCIAL: Farmacia PWS 22859
 TEL: 55 2653 8539 CORREO:
 DIRECCIÓN: Av. de Servicio Público 300 Puerto de Varas 45134 Zapopan Jalisco
 Accesibilidad a la zona de trabajo: OBRA EN DESARROLLO, ESPESOR AMPARO PARA
 Hacer la estructura.
 Requerimientos especiales:

Reglamento de ingreso: EQUIPO DE PP. Horario:
 Documentos: DUE/IMSS Otros: 8:00 - 6:00 AM
 Equipo a suministrar: Rampa Elevador Cantidad: 1 Cap. Carga: 300kg U. Hidráulica: 3 HP
 Equipo Especial:

RAMPA CARACTERÍSTICAS				ELEVADOR CARACTERÍSTICAS			
PARKING LIFT	ALT ELEVACIÓN	ANDÉN	CLASIFICACIÓN	TIPO DE CABINA	APERTURA	90	180
TR EVOLUTION		NIV HIDRA / HD	CARGA	MED / SEMI	ESTACIONES	2	
HEAVY DUTY	H. LIBRE	NIV MECÁNICA	DISCA <input checked="" type="checkbox"/>	CREW V1/V2	ALT ELEVACIÓN	4.15	
TR ONE		RHINO TI / TI HD	AUTOS	FULL VOX / VOX EVO	DIMENSIONES CABINA INTERIOR		
DIMENSIONES DE PLATAFORMA		TALLER	CAMILLAS	VOX PLATAFORMA			
1.9 X 3.75	2.00 X 3.75	2 POST / HD	TJERAS	FOSO			
2.10 X 3.75	1.90 X 3.50	PORTERIA	UNDERRAMP	0.3 0.45 0.6			
2.00 X 3.50	2.1 X 3.50	FRENERA	ESPECIAL	L= 1.25 A= 1.25			

Características especiales:
 Condicionantes y dimensiones de acceso:

Requerimiento estructural (Firme o foso): Firme de concreto de 15 cm de espesor con resistencia de 250Kg/cm2. con malla electrosoldada 5/5,10-10

Componentes Adicionales:

TRABAJO A REALIZAR				TECNO RAMPA
CLIENTE	SI	NO		
FIRME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GUÍA MECÁNICA	EN PROCESO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:	<input checked="" type="checkbox"/>		SOLICITUDES ADICIONALES	
ELEMENTOS DE FIJACIÓN:	<input checked="" type="checkbox"/>			

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA										
UNIDAD HIDRÁULICA:	2	5	10	15	20	ESP	HP	ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA								INSTALADA	NO INSTALADA	ACCESORIO EXTRA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA						<input checked="" type="checkbox"/>		TIPO	TUBERÍA	CANALETA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA								ESPESOR	DELGADA	GRUESA

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:
 ACEPTO COSTO ADICIONAL (NOMBRE Y FIRMA):
 RESPONSABLE OBRA ELÉCTRICA (NOMBRE Y FIRMA):

ACABADOS RAMPAS / ELEVADORES									
PINTURA			PINTURA			PAREDES INTERIORES		CRISTAL	
COLORES DE LINEA	ROJO	GRIS	NEGRO	DE LINEA	BLANCO	CROMO	ALUCOBOND	CLARO	<input checked="" type="checkbox"/>
PLATAFORMA				Cod.	SILVER MENT	<input checked="" type="checkbox"/>	METAL DESPLAGADO	TINTEX	
COLUMNAS				Cod.	NEGRO		LAMINA PERFORADA	ESMERILADO	<input checked="" type="checkbox"/>

SOLICITUD ADICIONAL
 ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

ARQ. ERIC VILLALÓN
 TECNORAMPA


FRANCISCO MANUEL GONZALEZ
 NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE



NOTA: SE PODRÁN INSTALAR CONTROLADORES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA: REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE. **13480 - 22857**

Observaciones generales - **ESPACIOS AMPLIOS OBRA EN PROCESO**
TRAZO MATERIAL PARA PROTECTOR A BAMBOS

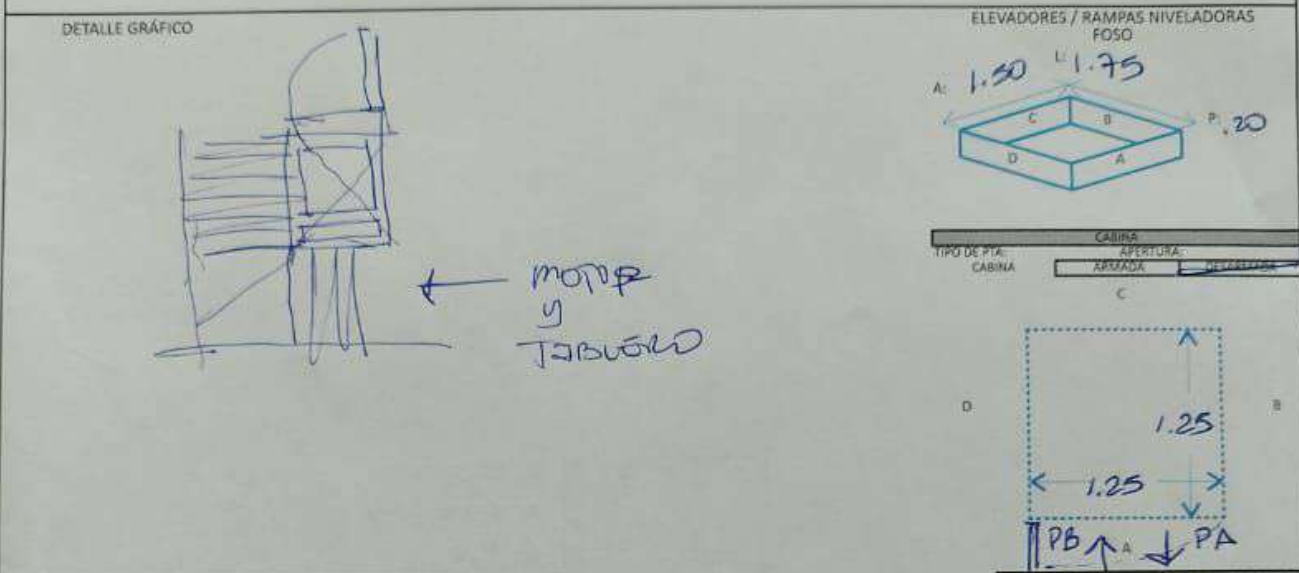

ISOMÉTRICO CRISTALES		TIPO DE ANCLAJE	
		ESTRUCTURA <input checked="" type="checkbox"/>	
		CADENAS <input type="checkbox"/>	
		PLACA <input type="checkbox"/>	
		PLACA CON ESPARRAGOS <input type="checkbox"/>	

ACCESOS POR NIVEL		GRÁFICA DE NIVELES	
		H:	
		ESPESOR	
		H:	
		ESPESOR	
		H:	
		ESPESOR	
		H:	4.00
		ESPESOR	
		H:	

NOTA: ESPECIFICAR APERTURA DE PUERTAS EN ELEVADOR, ESQUEMA DE TRAYECTORIA DE CONEXIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA.

ISOMÉTRICO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA	RAMPA		ELEVADOR	
	ÁREA	TIPO DE CONEXIÓN	BOTONERAS	
	MURO	DISPARO	PEDESTAL	<input checked="" type="checkbox"/> CANALIZADA POR TECNORAMPA
	PISO	CAWIA (Per Cliente)	SOBREPUESTA	EMPOTRADAS
	DIST. DE CABLE 4 X 12		EMPOTRADAS	ELECTRO IMANES
EXTRAS:				

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y LA ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONA ASIGNADA PARA RECEPCIÓN DEL EQUIPO: 1-	TEL:
2-	TEL:

ARQ. ANTONIO BENITEZ
TECNORAMPA

FCO. HANUEL GONZ.
NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE

VE-FO-01 REV00
