

CLIENTE: <u>APD MARIANA DE LA TORRE</u>							# <u>20749</u>					
RAZÓN SOCIAL <u>INTRAURBANA SUR SA DE CV.</u>												
TEL: <u>331 975 7821</u>				CORREO:								
DIRECCIÓN: <u>AVDA PAZ 2521A, ARLOS VALAZTA, 44130 CIDL JAL</u>												
Accesibilidad a la zona de trabajo:		<u>OBRA NUEVA</u>										
Requerimientos especiales:												
Reglamento de Ingreso: <u>OK PEU - PEPESO</u>						Horario: <u>8:30 a 4:00</u>						
Documentos: <u>see / mss /</u>						Otros:						
Equipo a suministrar:		Rampa	Elevador	<input checked="" type="checkbox"/>	Cantidad	<u>1</u>	Cap. Carga	<u>500</u>	U.Hidráulica	<u>2</u>	HP	
Equipo Especial		<u>ELEVADOR TIPO TIPOA.</u>										
RAMPA CARACTERÍSTICAS					ELEVADOR CARACTERÍSTICAS							
PARKING LIFT		ALT ELEVACIÓN		ANDÉN	CLASIFICACIÓN		TIPOR DE CABINA		APERTURA	N	90	<input checked="" type="checkbox"/> 180
TR EVOLUTION				NIV HIDRA / HD	CARGA		MED / SEMI		ESTACIONES		<u>2</u>	
HEAVY DUTY		H. LIBRE		NIV MECANICA	DISCA	<input checked="" type="checkbox"/>	CREW V1/V2		ALT ELEVACION		<u>1.15</u>	
TR ONE				RHINO TI / TI HD	AUTOS		FULL VOX / VOX EVO		DIMENSIONES CABINA INTERIOR			
DIMESIONES DE PLATAFORMA				TALLER	CAMILLAS		VOX PLATAFORMA					
1.9 X 3.75		2.00 X 3.75		2 POST/ HD	TIJERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	FOSO					
2.10 X 3.75		1.90 X 3.50		PORTERIA	UNDERRAMP		0.2	0.3	0.45	0.6		
2.00 X 3.50		2.1 X 3.50		FRENERA	ESPECIAL		L=	A=	P=	L=	A=	
Características especiales:												
Condicionantes y dimensiones de acceso:												

Requerimiento estructural (Firme o foso) : Firme de concreto de 15 cm de espesor con resistecia de 250kg/cm2. com malla electrosoldada 6/6,10-10

Componentes Adicionales:

TRABAJOS A REALIZAR

CLIENTE		SI	NO	TECNO RAMPA	
FIRME	<input checked="" type="checkbox"/>	FOSO	<input checked="" type="checkbox"/>	GUÍA MECÁNICA	<u>EN PROGRESO.</u>
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:			<input checked="" type="checkbox"/>	SOLICITUDES ADICIONALES	
ELEMENTOS DE FIJACION:	<input checked="" type="checkbox"/>				

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

UNIDAD HIDRÁULICA	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 20	ESP	HP	ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
INSTALACION ELECTRICA MONOFASICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FISICA	<input checked="" type="checkbox"/>								INSTALADA	<input type="checkbox"/>	NO INSTALADA	<input type="checkbox"/>	ACCESORIO EXTRA	<input type="checkbox"/>
INSTALACION ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FISICA									TIPO	TUBERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	CANALETA	<input type="checkbox"/>	
INSTALACION ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FISICA									ESPESSOR	DELGADA	<input type="checkbox"/>	GRUESA	<input checked="" type="checkbox"/>	

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

ACEPTO COSTO ADICIONAL (NOMBRE Y FIRMA):

RESPONSABLE OBRA ELÉCTRICA (NOMBRE Y FIRMA):

ACABADOS RAMPAS / ELEVADORES

PINTURA				PINTURA				PAREDES INTERIORES		CRISTAL	
COLORES DE LINEA	ROJO	GRIS	NEGRO	De Línea	BLANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	CROMO	ALUCOBOND	CLARO		
PLATAFORMA				Cod.	SILVER MET	<input checked="" type="checkbox"/>	COLOR ESPECIAL	METAL DESPLAGADO	TINTEX		
COLUMNAS				Cod.	NEGRO	<input type="checkbox"/>	Cod.	LAMINA PERFORADA	ESMERILADO		

SOLICITUD ADICIONAL

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

APD Mariana de la Torre
 TECNORAMPA


Luis Manuel Rojas
 NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE

NOTA: SE PONDRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGUN RECLAMO FUTURO.

NOTA: REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE. 29749


Observaciones generales

DETALLE GRAFICO

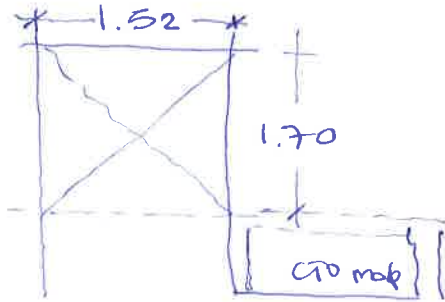

- Los espacios son conforme a la guía mecánica.
- La 1ra sem de ocupable distancia
- Botoneras en pedestal (2 pzas)


ELEVADORES / RAMPAS NIVELADORAS FOSO




TIPO DE PTA: CABINA

CABINA APERTURA:

ARMADA	DESARMADA
--------	-----------

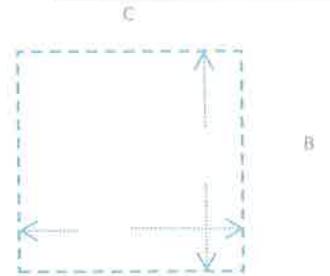


ISOMETRICO CRISTALES



TIPO DE ANCLAJE

- ESTRUCTURA
- CADENAS
- PLACA
- PLACA CON ESPARRAGOS

ACCESOS POR NIVEL

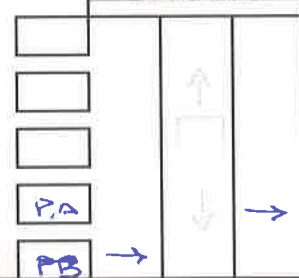

GRAFICA DE NIVELES

ESPESOR:
H:
ESPESOR:
H:
ESPESOR:
H:
ESPESOR:
H: <u>1.75</u>
ESPESOR:
H:

NOTA: EXPECIFICAR APERTURA DE PUERTAS EN ELEVADOR, ESQUEMA DE TRAYECTORIA DE CONEXIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA.

ISOMETRICO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA	RAMPA		ELEVADOR	
	ÁEREA	TIPO DE CONEXIÓN	BOTONERAS	
	MURO	DISPARO	PEDESTAL <input checked="" type="checkbox"/>	CANALIZADA POR TECNORAMPA <input checked="" type="checkbox"/>
	PISO	CLAVIJA (Por Cliente)	SOBREPUESTA	EMPOTRADAS
	DIST. DE CABLE 4 X 12		EMPOTRADAS	ELECTRO IMANES
	EXTRAS:			

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y LA ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONA ASIGNADA PARA RECEPCIÓN DEL EQUIPO:	1.- <u>APD Jose Luis Flores</u>	TEL: <u>331 461 1219</u>
	2.- <u>Lois Miguel Avila Solórzano</u>	TEL: <u>33 2256 4971</u>

APD [Signature]
TECNORAMPA

[Signature]
LOIS MIGUEL AVILA SOLÓRZANO
NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE
