

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
TEC080710M22
Tels.: 01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecnorampa.com.mx
014272728119
LADA SIN COSTO:
018006230332

COT. 19916

NOMBRE DEL CLIENTE: Acc. ARIANNA BOCAJERA FECHA: 6.10.2020
 RAZÓN SOCIAL: YOUNG CHANG - HYUNDAI
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: BOULEVARD LIA #777, PESQUERA, NUEVO LEON CP. 66679
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO: _____ CORREO: SHANTES@OUTLOOK.PS

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: _____

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO
 COLUMNAS LARGAS CORTAS EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
 ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
 No. PARTES OTRO DC3 SOLDADORAS, ALIJAS, AODADO
 CONDICIONES PARA INGRESAR: AVANAR A CUENTE, PLATICA DE SEGURIDAD, EXTINTOR

DOCUMENTOS: _____

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 20 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: CABINA SEMICOMPLETA UO INDUSTRIAL

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
 CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10M ELEVACIÓN 5.05 MTJ
 DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) ESTACIONES 2 EST.
 AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10M CAPACIDAD DE CARGA 500 kg
 UNIDAD HIDRÁULICA 2 HP.

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
 LARGO 1.85 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
 ANCHO 1.60 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
 PROFUNDIDAD .20 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.40 ANCHO 1.40

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

CLIENTE: SI NO
 FOSO
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

TECNORAMPA
 GUÍA MECÁNICA
 SOLICITUDES ADICIONALES _____

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA PARED
 SI TUBERÍA DELGADA
 NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA
 ACCESORIOS EXTRAS COSTO
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

 NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

COLORES

BLANCO SILVER METALLIC
 AZUL/GRIS PANTONE
 AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR

ACABADO DE ELEVADOR

METAL DESPLEGADO
 LÁMINA PINTOR
 OTRO _____

CRISTAL

CLARO
 TINTEX
 ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL: _____

ACEPTO Y CONÓZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA

JUAN PABLO HERRERA
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

MANEJA
 PERMISO
 MANEJA
 USA

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: - RAUFA MONTAJE / REQUISITO INDISPENSABLE DC3.
- CABINA SEU, PARA USO MIXTO CARGA Y PERSONAS.

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V 220 V GENERADOR

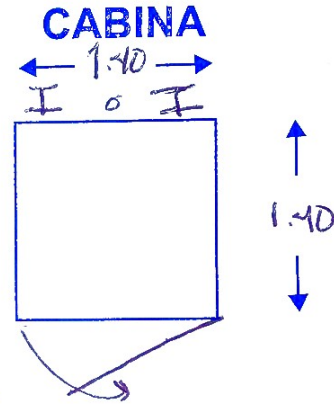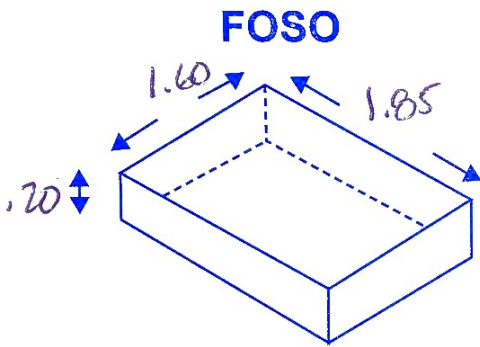

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL SOBREPUESTAS DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5.00 mts

EMPOTRADAS CANALIZADAS POR TECNORAMPA

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: _____ TELÉFONO 1): _____
CONTACTO 2): _____ TELÉFONO 2): _____

[Signature]
TECNORAMPA

Juan Pablo Velazquez
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
