



CLIENTE: JNG KIRIL BASCUNAN # 32820
 RAZÓN SOCIAL: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DEL NORTE SA DE CV.
 TEL: 686 163 5555 CORREO: kiril@efcemearquitectos.com
 DIRECCIÓN: DIGNONA BARRIO SAN ISIDRO 3214 A SANITARIO MAXXAPAN 72760, GUANAJUATO
 Accesibilidad a la zona de trabajo: TRACC MULTISIZO CAJON 802. PUE.

Requerimientos especiales: —
 Reglamento de Ingreso: OPORDY RESPETO Horario: 8:00 a 6:00PM
 Documentos: DNE y mss Otros: —
 Equipo a suministrar: Rampa 1 Elevador 1 Cantidad 1 Cap. Carga 7000 IBS U.Hidráulica 3 HP
 Equipo Especial: —

RAMPA CARACTERÍSTICAS				ELEVADOR CARACTERÍSTICAS								
PARKING LIFT	ALT ELEVACIÓN	ANDÉN		CLASIFICACIÓN	TIPOR DE CABINA				APERTURA	N	90	180
TR EVOLUTION	<u>2.10m</u>	NIV HIDRA / HD		CARGA	MED / SEMI				ESTACIONES			
HEAVY DUTY	H. LIBRE	NIV MECANICA		DISCA	CREW V1/V2				ALT ELEVACION			
TR ONE	<u>LIBRE TPL</u>	RHINO TI / TI HD		AUTOS	FULL VOX / VOX EVO				DIMENSIONES CABINA INTERIOR			
DIMENSIONES DE PLATAFORMA				TALLER				FOSO				
1.9 X 3.75	2.00 X 3.75	2 POST/ HD		CAMILLAS	VOX PLATAFORMA							
2.10 X 3.75	1.90 X 3.50	PORTERIA		TIJERAS								
2.00 X 3.50	2.1 X 3.50	FRENERA		UNDERRAMP	0.2	0.3	0.45	0.6				
				ESPECIAL	L=	A=	P=	L=	A=			

Características especiales: —
 Condicionantes y dimensiones de acceso: —

Requerimiento estructural (Firme o foso): Firme de concreto de 15 cm de espesor con resistencia de 250kg/cm2. com malla electrosoldada 6/6,10-10

Componentes Adicionales: —

TRABAJOS A REALIZAR

CLIENTE	SI	NO	TECNO RAMPA	
FIRME	<input checked="" type="checkbox"/>		GUÍA MECÁNICA	<u>EN PROCESO</u>
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:	<input checked="" type="checkbox"/>		SOLICITUDES ADICIONALES	<u>—</u>
ELEMENTOS DE FIJACION:	<input checked="" type="checkbox"/>			

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

UNIDAD HIDRÁULICA	2	<u>3</u>	5	10	15	20	ESP	HP	ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA		
INSTALACION ELECTRICA MONOFASICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FISICA									INSTALADA	NO INSTALADA	ACCESORIO EXTRA
INSTALACION ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FISICA								<input checked="" type="checkbox"/>	TIPO	TUBERIA	CANALETA
INSTALACION ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FISICA									ESPESOR	DELGADA	GRUESA

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: —
 ACEPTO COSTO ADICIONAL (NOMBRE Y FIRMA): —
 RESPONSABLE OBRA ELÉCTRICA (NOMBRE Y FIRMA): —

ACABADOS RAMPAS / ELEVADORES


PINTURA				PINTURA				PAREDES INTERIORES		CRISTAL	
COLORES DE LINEA	ROJO	GRIS	NEGRO	De Línea	BLANCO	CROMO		ALUCOBOND	CLARO		
PLATAFORMA				Cod.	SILVER MET	COLOR ESPECIAL		METAL DESPLAGADO	TINTEX		
COLUMNANAS				Cod.	NEGRO	Cod.		LAMINA PERFORADA	ESMERILADO		

SOLICITUD ADICIONAL: DE LINEA
 ACEPTO Y CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
 APO JOSÉ A. BENÍTEZ TECNORAMPA
KIRIL C BASCUNAN LEVANTAMIENTO
 NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE


NOTA: SE PONDRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGUN RECLAMO FUTURO.

NOTA: REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE. 32830 - 26624

Observaciones generales: ESPACIOS AMPLIOS PARA TRABAJAR, CABIN 802
LEVAR MENSAJE ELECTRICO PARA LA INSTALACION

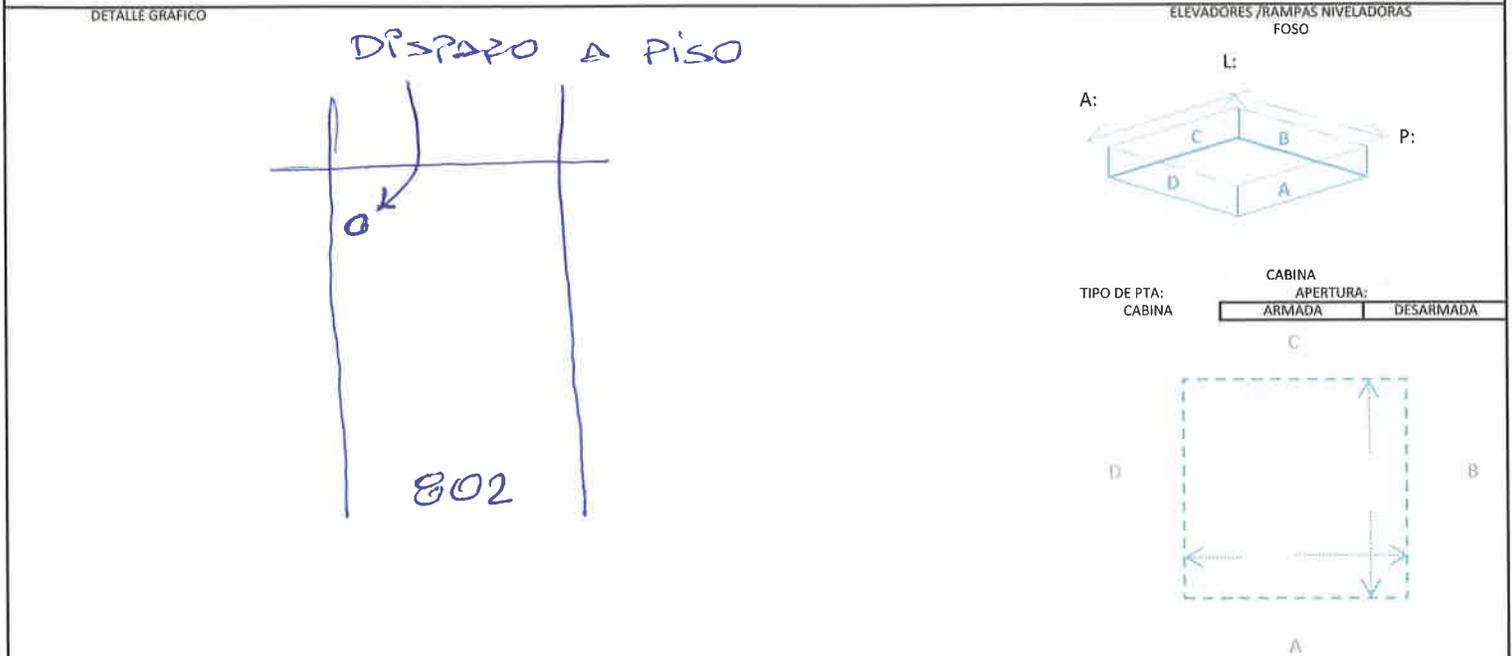

ISOMETRICO CRISTALES



TIPO DE ANCLAJE

ESTRUCTURA

CADENAS

PLACA

PLACA CON ESPARRAGOS

ACCESOS POR NIVEL

	↑	↓
	↑	↓
	↑	↓
	↑	↓
	↑	↓
	↑	↓
	↑	↓

GRAFICA DE NIVELES

ESPESOR:	H:

NOTA: EXPECIFICAR APERTURA DE PUERTAS EN ELEVADOR, ESQUEMA DE TRAYECTORIA DE CONEXIÓN HIDRAÚLICA Y ELÉCTRICA.

ISOMETRICO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA	RAMPA		ELEVADOR	
ÁREA	TIPO DE CONEXIÓN	BOTONERAS		
MURO	DISPARO	PEDESTAL	CANALIZADA POR TECNORAMPA	
PISO <input checked="" type="checkbox"/>	CLAVIJA (Por Cliente)	SOBREPUESTA	EMPOTRADAS	
DIST. DE CABLE 4 X 12		EMPOTRADAS	ELECTRO IMANES	
EXTRAS:				

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y LA ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONA ASIGANDA PARA RECEPCIÓN DEL EQUIPO:	1.- <u>KIRIL BASCUNIAN</u>	TEL: <u>606 1639555</u>
2.-		TEL: <u> </u>

APQ JOSÉ A. RIVERA
TECNORAMPA

KIRIL C BASCUNIAN
NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE
