

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.:(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@teconrampa.com.mx  
 4272728119  
 LADA SIN COSTO:  
 800 623 0332

**Nº 20157**

NOMBRE DEL CLIENTE: GJA FECHA: 21/09/2021  
 RAZÓN SOCIAL: Oficinas de IKEA  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Puebla Puebla  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES 1 OTRO \_\_\_\_\_  
 CONDICIONES PARA INGRESAR: Seguridad industrial  
 DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: \_\_\_\_\_ %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: Crew

**CLASIFICACIÓN** TIPO DE CABINA  
 CARGA  CAMILLAS  MEDIDA 1.10 M  ELEVACIÓN 3.25mts  
 DISCAPACITADOS  TIJERAS  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)  ESTACIONES 2  
 AUTOS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10 M  CAPACIDAD DE CARGA 500 kg  
 UNIDAD HIDRÁULICA 2 hp

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 LARGO 1.75mts ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ANCHO 1.50mts ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM   
 PROFUNDIDAD 0.20mts DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.25mt ANCHO 1.25mts

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM². ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA 2 electroimanes en puerta del cliente

**TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:**

CLIENTE: SI NO TECNORAMPA  
 FOSO   GUÍA MECÁNICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA   SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_  
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA  110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA TUBERÍA PARED  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA SI  TUBERÍA  DELGADA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA NO  CANALETA  GRUESA

**ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

**RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA**

INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTOS   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA DE TÉRMINO \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**ACABADO DE ELEVADOR**

COLORES CRISTAL  
 BLANCO  SILVER METALLIC  METAL DESPLEGADO  CLARO  pte  
 AZUL/GRIS  PANTONE  LÁMINA PINTOR  TINTEX   
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR  OTRO \_\_\_\_\_ ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_  
 ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR



TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: 2 electroimanes en puertas del cliente  
Estructura de 4 puntos de PTR

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V  220 V  GENERADOR

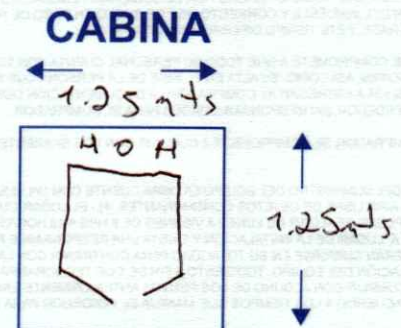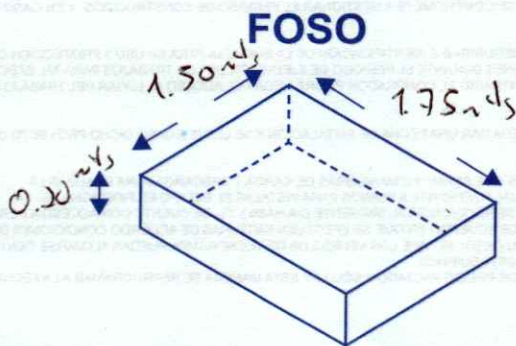

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA



BOTONERAS

- PEDESTAL  EMPOTRADAS
- SOBREPUESTAS  CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA  
ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 3mts

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: \_\_\_\_\_ TELÉFONO 1): \_\_\_\_\_  
CONTACTO 2): \_\_\_\_\_ TELÉFONO 2): \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

TECNORAMPA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
