

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO  
 Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO  
 TEC080710M22  
 Tels.:(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecorampa.com.mx  
 4272728119  
 LADA SIN COSTO:  
 800 623 0332

**Nº 20054**

NOMBRE DEL CLIENTE: Arg. Roberto Avila FECHA: 05-02-21  
 RAZÓN SOCIAL: Inmobiliaria Mazaret SA de CV.  
 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: AV. CONSTITUYENTES ORIENTE S/N COL.  
 REFERENCIA DE DIRECCIÓN: Panamericano, Queretaro  
20446-14295 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: DESCRIPA SAN

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO  ARMADO  EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL  
 COLUMNAS LARGAS  CORTAS  ZAPATOS  CHALECO  LENTES  CASCO   
 No. PARTES  OTRO Cable - Arnes.  
 CONDICIONES PARA INGRESAR: IMSS DC3 altura.

DOCUMENTOS: \_\_\_\_\_  
 AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 70 %  
 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: \_\_\_\_\_

**CLASIFICACIÓN** TIPO DE CABINA  
 CARGA  CAMILLAS  MEDIDA 1.10 M  ELEVACIÓN 12 ms. 11.40  
 DISCAPACITADOS  TIJERAS  SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M)  ESTACIONES 5  
 AUTOS  UNDER RAMP  COMPLETA 2.10 M  CAPACIDAD DE CARGA 3500  
 UNIDAD HIDRÁULICA 10 HP

DIMENSIÓN DE FOSO: ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM   
 LARGO 6.00 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM   
 ANCHO 3.20 ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, ~~45 CM~~ 60   
 PROFUNDIDAD 0.60 DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 5.80 ANCHO 2.56

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM². ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

**TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:**

CLIENTE: SI NO TECNORAMPA  
 FOSO   GUÍA MECÁNICA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA   SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_  
 CANALIZACIÓN DE BOTONERAS

**ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA**

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA TUBERÍA PARED  
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA SI  TUBERÍA  DELGADA   
 INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA NO  CANALETA  GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA  
 INSTALADA  NO INSTALADA   
 ACCESORIOS EXTRAS COSTOS   
 ACEPTO COSTO ADICIONAL: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA FECHA DE TÉRMINO FIRMA

**ACABADO DE ELEVADOR**

COLORES CRISTAL  
 BLANCO  SILVER METALLIC  linea METAL DESPLEGADO  CLARO   
 AZUL/GRIS  PANTONE  columnas negras CÓDIGO plata fos M. ALÁMINA PINTOR  TINTEX   
 AZUL/BLANCO  ALUCOBOND COLOR  6115 1150 OTRO \_\_\_\_\_ ESMERILADO

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_  
 ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR  
Arg. Salvador Silva S. Arg. Roberto Avila  
 TECNORAMPA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTRÓLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

OBSERVACIONES GENERALES: higara estructura de acero

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V  220 V  GENERADOR

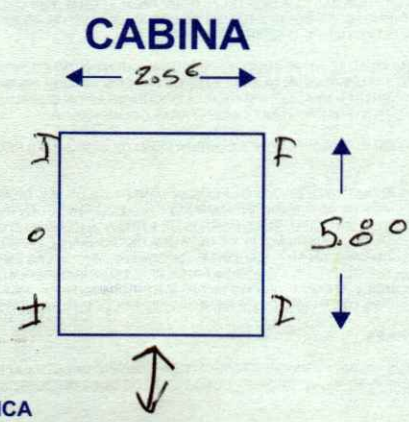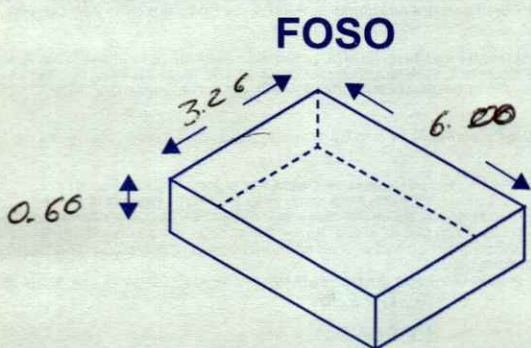

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA

BOTONERAS

PEDESTAL  SOBREPUESTAS  DISTANCIA APROXIMADA ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA 5m75.  EMPOTRADAS  CANALIZADAS POR TECNORAMPA

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: \_\_\_\_\_ TELÉFONO 1): \_\_\_\_\_ CONTACTO 2): \_\_\_\_\_ TELÉFONO 2): \_\_\_\_\_

Arg. Salvador Silva S.  
TECNORAMPA

Arg. Roberto Avila  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR
