

AUTOPISTA MÉXICO - QUERÉTARO
Km 175 + 494 EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
TEC080710M22
Tels.:01(427) 272-4041 / 272-8119

ventas@tecorampa.com.mx
0142772728119
LADA SIN COSTO:
018006230332

NOMBRE DEL CLIENTE: Daniel Hernandez FECHA: 10-Jun-22
RAZÓN SOCIAL: BOCOT cafe SA de CV
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Felipe Carrillo Puerto 4 Col. Centro Coyacacn
REFERENCIA DE DIRECCIÓN: _____
TELÉFONO: _____ CORREO: _____

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: Cafeteria BOCOT

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ARMADO EQUIPO DE SEGURIDAD ESPECIAL
COLUMNAS LARGAS CORTAS ZAPATOS CHALECO LENTES CASCO
No. PARTES 2 OTRO _____
CONDICIONES PARA INGRESAR: IVE

DOCUMENTOS: _____

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: 70 %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: MONTA PLATOS

CLASIFICACIÓN TIPO DE CABINA
CARGA CAMILLAS MEDIDA 1.10M ELEVACIÓN 4.20m
DISCAPACITADOS TIJERAS SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10M) ESTACIONES 2
AUTOS UNDER RAMP COMPLETA 2.10M CAPACIDAD DE CARGA 500 kg
MONTAPLATO UNIDAD HIDRÁULICA 2 Hp

DIMENSIÓN DE FOSO:
LARGO 1.18 ELEVADORES DE TIJERA, 45CM
ANCHO .70 ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM
PROFUNDIDAD ✓ ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM
DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO .80 ANCHO .50

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA
COMPONENTES EXTRA _____

TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| CLIENTE: | SI | NO | TECNORAMPA |
| FOSO | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | GUÍA MECÁNICA <input checked="" type="checkbox"/> |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | SOLICITUDES ADICIONALES _____ |
| CANALIZACIÓN DE BOTONERAS | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA ✓ TUBERÍA PARED
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA SI TUBERÍA DELGADA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA NO CANALETA GRUESA

ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA NO INSTALADA
ACCESORIOS EXTRAS COSTO

RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

ACEPTO COSTO ADICIONAL: _____
NOMBRE Y FIRMA _____ FECHA DE TÉRMINO _____ FIRMA _____

ACABADO DE ELEVADOR

COLORES CRISTAL
BLANCO SILVER METALLIC METAL DESPLEGADO CLARO
AZUL/GRIS PANTONE LÁMINA PINTOR TINTEX
AZUL/BLANCO ALUCOBOND COLOR OTRO _____ ESMERILADO
CÓDIGO _____
SOLICITUD ADICIONAL: _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Mauricio Company TECNORAMPA Daniel Hernandez NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE

NOTA

SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIR LOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.



NOTA

REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DE TERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HALLA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.


OBSERVACIONES GENERALES: _____

DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN

110 V 220 V GENERADOR

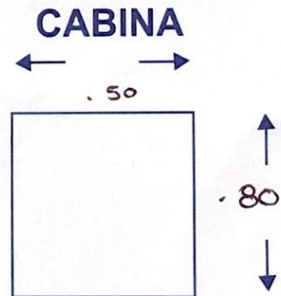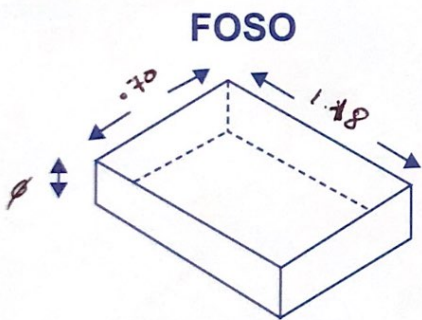

INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA



BOTONERAS

PEDESTAL
SOBREPUESTAS

EMPOTRADAS
 CANALIZADAS POR TECNORAMPA

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA _____

EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DECISIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

NOTA:

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO.

CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONAS ASIGNADAS PARA RECEPCIÓN DE EQUIPO

NOMBRE: _____ TELÉFONO 1): _____

CONTACTO 2): _____ TELÉFONO 2): _____

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Mauricio Compagny,
TECNORAMPA

Daniel Hernandez.
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
