

BLVD. HIDALGO #177 A COL. CENTRO  
C.P. 76800 SAN JUAN DEL RIO, QRO.

LADA SIN COSTO:  
01 800 6330 332, 01 800 8380 850  
atencionclientes@tecnorampa.com.mx

NOMBRE DEL CLIENTE: Eric Franco FECHA: 13-07-18  
RAZÓN SOCIAL: MTQ de Mexico SA de CV  
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: Av. Guadalupe #420-A Tecnologic park  
REFERENCIA DE DIRECCIÓN: 2a Zon Pan Jalisco  
15012-5408 TELÉFONO: \_\_\_\_\_ CORREO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR / ACCESOS DE INSTALACIÓN: \_\_\_\_\_

ACCESO DE EQUIPO DESARMADO ☐ ARMADO ☒  
COLUMNAS LARGAS ☒ CORTAS ☐  
No. PARTES ☐  
CONDICIONES PARA INGRESAR: IMSS, IFE HORARIO: 8am - 6pm  
DOCUMENTOS: Instaladores con D53 (plata) OTROS \_\_\_\_\_  
AVANCE ACTUAL DE LA OBRA: \_\_\_\_\_ %

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: \_\_\_\_\_

## CLASIFICACIÓN

CARGA ☒ CAMILLAS ☐  
DISCAPACITADOS ☐ TIJERA ☐  
AUTOS ☐ UNDER RAMP ☐

## TIPO DE CABINA

MEDIA 1.10 M ☐  
SEMICOMPLETA (SIN TECHO 2.10 M) ☒  
COMPLETA 2.10 M ☐

ELEVACIÓN 7.70  
ESTACIONES 2  
CAPACIDAD DE CARGA 1500 kg  
UNIDAD HIDRÁULICA 10 HP

DIMENSIÓN DE FOSO:  
LARGO 2.20 1.76  
ANCHO 2.70 2.20  
PROFUNDIDAD 0.60

ELEVADORES DE TIJERA, 45 CM ☐  
ELEVADORES DE 2 COLUMNAS, 20 CM ☐  
ELEVADORES DE 4 COLUMNAS, 45 CM ☐  
DIMENSIÓN DE CABINA INTERIOR LARGO 1.50 ANCHO 1.50

NOTA: FIRME DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON RESISTENCIA DE 250 KG/CM2. ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA

COMPONENTES EXTRA \_\_\_\_\_

## TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR:

CLIENTE: SI NO  
FOSO ☒ ☐  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ☒ ☐  
CANALIZACIÓN DE BOTONERAS ☒ ☐

TECNORAMPA  
GUÍA MECÁNICA ☒  
SOLICITUDES ADICIONALES \_\_\_\_\_

## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA  
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA

TUBERÍA SI ☒ TUBERÍA ☒  
NO ☐ CANALETA ☐  
PARED DELGADA ☐  
GRUESA ☒

## ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALADA ☐ NO INSTALADA ☐ OTRO  
ACCESORIOS EXTRAS COSTO ☐  
ACEPTO COSTO ADICIONAL \_\_\_\_\_

## RESPONSABLE DE LA OBRA ELÉCTRICA

NOMBRE Y FIRMA

FECHA DE TÉRMINO

FIRMA

## ACABADO DEL ELEVADOR

### COLORES

BLANCO ☒ SILVER METALLIC ☐  
AZUL / GRIS ☐ PANTONE ☐ CÓDIGO \_\_\_\_\_  
AZUL / BLANCO ☐ ALUCOBOND COLOR ☐

METAL DESPLEGADO ☒  
LÁMINA PINTRO ☐  
OTRO \_\_\_\_\_

### CRISTAL

CLARO ☐  
TINTEX ☐  
ESMERILADO ☐

SOLICITUD ADICIONAL: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Jorge Salvador Silva  
TECNORAMPA

Eric Franco  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE



**NOTA:**

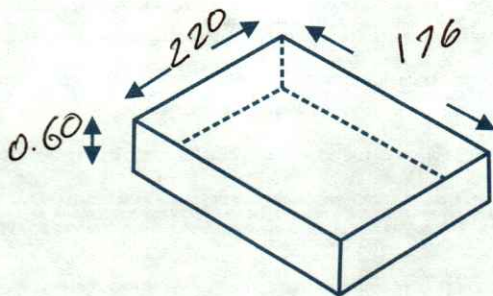
SE PODRÁN INSTALAR CONTROLES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCION AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS SERÁ BAJO RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

**NOTA:**

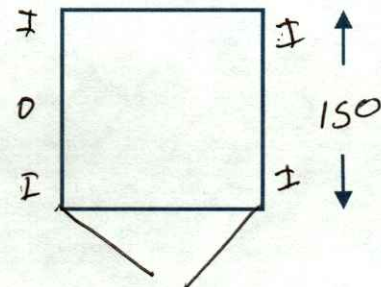
REVISE Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HAYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE.

**OBSERVACIONES GENERALES:**

equipo de Seguridad completo  
extinguidor, 10na antichispas.

**DISTANCIA Y CORRIENTE PARA TRABAJOS DE INSTALACIÓN**110 V ☐220V ☒GENERADOR ☒**FOSO****CABINA**

150


**INFORMACIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA****BOTONERAS**PEDESTAL ☐SOBREPUESTAS ☒

DISTANCIA APROXIMADA

ELEVADOR Y UNIDAD HIDRÁULICA

☐ EMPOTRADAS☒ CANALIZADAS POR TECNORAMPA

5 mts.



EN CASO DE NO ESTAR EL ENCARGADO LAS PERSONAS QUE PUEDAN RECIBIR Y TOMAR ALGUNA DESICIÓN DEL EQUIPO A INSTALAR SON:

**NOTA:**

PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

*Arg. Salvador Silva*  
TECNORAMPA

*[Firma del Cliente]*  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
