FECHA: FEB 17 - 2023

LEVANTAMIENTO

Cotización # Nº 00056

CLIENTE:	Lilia Ivone Pineda Castañeda.									# 289986.	
RAZÓN SOCIAL	VIP										
TEL:	55 18009176			CORREO	ray.z.rosas@gmail.com.						
DIRECCIÓN:	Emiliano Zapata #15 Col Benito Juarez, Xochitepec, Morelos CP. 62790										
Accesibilidad a la zona de trabajo	Sepa por estacionamiento, frente a la primaria.										
Requerimientos especiales:	Ninguno.										
Reglamento de ingreso:	Respetuoso clínica en funcionamiento								Horario:	8:00 a 6:00	
Documentos:	INE / IMSS.								Otros:		
Equipo a suministrar:	Rampa		Elevador	✓	Cantidad	1	Cap. Carga	500kg	U. Hidraulica	3 HP	
Equipo Especial	—										

RAMPA CARACTERÍSTICAS						ELEVADOR CARACTERÍSTICAS							
PARKING LIFT		ALT ELEVACIÓN		ANDÉN		CLASIFICACIÓN		TIPO DE CABINA		APERTURA	N	90	180
TR EVOLUTION				NIV HIDRA / HD		CARGA		MED / SEMI		ESTACIONES	3		
HEAVY DUTY		H. LIBRE		NIV MECÁNICA		DISCA		CREW V1/V2		ALT ELEVACIÓN	4.20.		
TR ONE				RHINO TI / TI HD		AUTOS		FULL VOX / VOX EVO		DIMENSIONES CABINA INTERIOR			
DIMENSIONES DE PLATAFORMA				TALLER		CAMILLAS	✓	VOX PLATAFORMA					
1.9 X 3.75		2.00 X 3.75		2 POST / HD		TIJERAS		FOSO					
2.10 X 3.75		1.90 X 3.50		PORTERIA		UNDERRAMP		0.2	0.3	0.45	0.6		
2.00 X 3.50		2.1 X 3.50		FRENERA		ESPECIAL		L=	A=	P=		L=	A=

Características especiales:	Sin pta. con sensor cortina.
Condicionantes y dimensiones de acceso:	—

Requerimiento estructural (Firme o foso) : Firme de concreto de 15 cm de espesor con resistencia de 250Kg/cm2. con malla electrosoldada 6/6,10-10

Componentes Adicionales:	—

TRABAJOS A REALIZAR

CLIENTE				SI	NO	TECNO RAMPA	
FIRME		FOSO			✓	GUÍA MECÁNICA	EN PROCESO.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA:					✓	SOLICITUDES ADICIONALES	SENSOR CORTINA EN LUGAR DE
ELEMENTOS DE FIJACIÓN:					✓		PUERTA Y ELECTROIMANES EN LAS ESTACIONES.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

UNIDAD HIDRÁULICA	2	3	5	10	15	20	ESP	HP

INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFASICA A 110 VAC CON NEUTRO Y TIERRA FÍSICA		ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
		INSTALADA		NO INSTALADA		ACCESORIO EXTRA	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA A 220 VAC CON NETURO Y TIERRA FÍSICA	✓	TIPO		TUBERÍA	✓	CANALETA	
INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA A 220 VAC CON NUETRO Y TIERRA FÍSICA		ESPESOR		DELGADA		GRUESA	✓

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:	—
ACEPTO COSTO ADICIONAL (NOMBRE Y FIRMA):	—
RESPONSABLE OBRA ELÉCTRICA (NOMBRE Y FIRMA)	—

ACABADOS RAMPAS / ELEVADORES

PINTURA					PINTURA				PAREDES INTERIORES		CRISTAL	
COLORES DE LINEA	ROJO	GRIS	NEGRO	DE LÍNEA	BLANCO		CROMO		ALUCOBOND		CLARO	✓
PLATAFORMA				Cod.	SILVER MENT	✓	COLOR ESPECIAL		METAL DESPLAGADO		TINTEX	
COLUMNAS				Cod.	NEGRO		Cod.		LAMINA PERFORADA		ESMERILADO	✓

SOLICITUD ADICIONAL:

ACEPTO Y CONOZCO LAS CARACTERÍSTICAS Y ACABADOS DEL EQUIPO A INSTALAR

Arq. Jesús A. Benítez.
TECNORAMPA

Raymundo Rosas
NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE

FECHA: FEB 17 - 2023

LEVANTAMIENTO

Cotización # Nº 00056

NOTA: SE PODRÁN INSTALAR CONTROLADORES INTERNOS EN LOS EQUIPOS COMO OPCIONAL AL CLIENTE Y DE ACUERDO A LA APLICACIÓN DEL EQUIPO PREVIAMENTE SOLICITADOS EN CASO DE REQUERIRLOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE, QUEDANDO EL PROVEEDOR LIBRE DE ALGÚN RECLAMO FUTURO.

NOTA: REVISÉ Y APRUEBO CADA UNO DE LOS PUNTOS QUE TRATA ESTE DOCUMENTO REFERENTE AL EQUIPO A INSTALAR, POR LO TANTO ESTOY CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES QUE EL PROVEEDOR DETERMINA, QUEDANDO LIBRE DE ALGÚN RECLAMO O CONDICIÓN QUE LE PRESIONE A CUBRIR EL COSTO O RESTAURAR ALGUNA PARTE DEL EQUIPO QUE SE HYA INSTALADO A PETICIÓN DEL CLIENTE. 28986

Observaciones generales: CLÍNICA EN OPERACIÓN, TRAER MATERIAL PARA PROTEGER PISOS Y ACABADOS.

DETALLE GRÁFICO

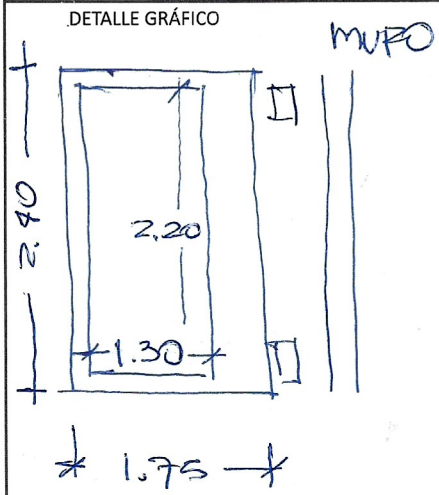

- CONTEMPLAR ESTRUCTURA DE PTR 4 x 4 CAL 7.
- ACCESO NEUTRO.
- SENSORES CORTINA.
- EQUIPO DESARMADO
- ACCESO LIMITADO. REVISAR FOTOS.

ELEVADORES / RAMPAS NIVELADORAS FOSO



CABINA	
TIPO DE PTA: CABINA	APERTURA: ARMADA / ~~DESARMADA~~

SIN PUERTA CON SENSORES CORTINA.

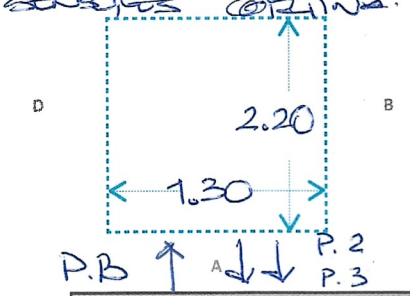

ISOMÉTRICO CRISTALES



TIPO DE ANCLAJE	
ESTRUCTURA	✓
CADENAS	
PLACA	
PLACA CON ESPARRAGOS	

ACCESOS POR NIVEL	GRAFICA DE NIVELES
	ESPESOR
	H:
	ESPESOR
	H:
	ESPESOR
⊤ →	H: 6.20
	ESPESOR
⊤ →	H: 3.10
	ESPESOR
⊤ →	H: 0.00

NOTA: ESPECIFICAR APERTURA DE PUERTAS EN ELEVADOR, ESQUEMA DE TRAYECTORIA DE CONEXIÓN HIDRAÚLICA Y ELÉCTRICA.

ISOMÉTRICO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA



RAMPA				ELEVADOR			
ÁEREA		TIPO DE CONEXIÓN		BOTONERAS			
MURO		DISPARO		PEDESTAL		CANALIZADA POR TECNORAMPA	
PISO		CLAVIJA (Por Cliente)		SOBREPUESTA		EMPOTRADAS	✓
DIST. DE CABLE 4 X 12				EMPOTRADAS		ELECTRO IMANES	

EXTRAS:

NOTA: PARA PODER EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN, LA OBRA CIVIL Y LA ELÉCTRICA DEBEN ESTAR TERMINADOS, ASÍ COMO TENER LIBRE EL ACCESO AL ÁREA DE INSTALACIÓN. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE LE ASIGNARÁ OTRA FECHA DE INSTALACIÓN DE ACUERDO A LAS FECHAS DISPONIBLES, SEGÚN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE MOMENTO. CONFIRMO ESTAR ENTERADO DEL PROCEDIMIENTO DE ORDEN DE PRODUCCIÓN.

PERSONA ASIGNADA PARA RECEPCIÓN DEL EQUIPO:	TEL:
1.- Ing. Raymundo Rosas	5518009176
2.- JOSÉ ALFREDO GOMEZ GUTIERREZ	7772083643

APO JESÚS A. BENÍTEZ
TECNORAMPA

Ing. Raymundo Rosas
NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE
