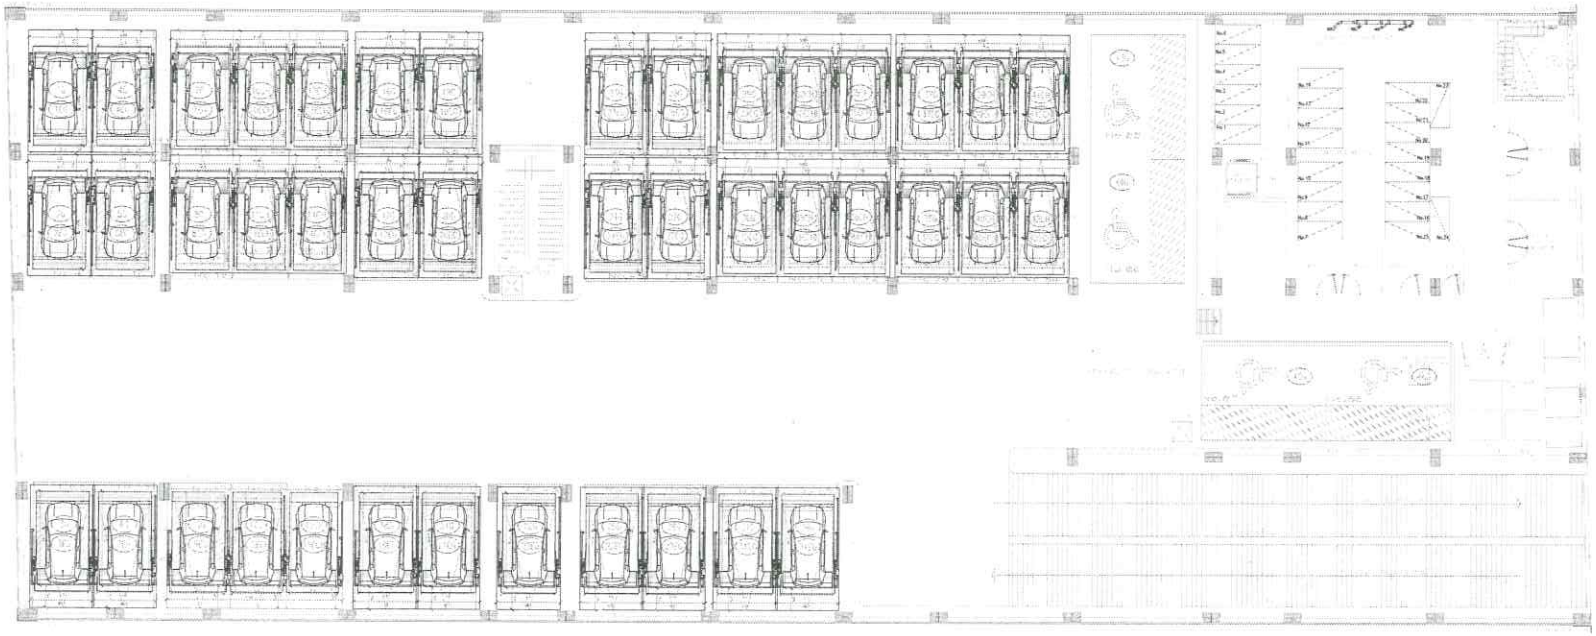

NOMBRE DE LA EMPRESA:
PROCSA / ORIENTE 2

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

CONTENIDO:
SEMBRADO DE RAMPAS
PARKING LIFT

VENDEDOR A CARGO:
LIC. LUIS FRANCISCO VILLA E.

ÁREA A CARGO DE DISEÑO:
INGENIERÍA DEL PRODUCTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:

OBSERVACIONES:
CANALIZACIÓN AÉREA

SIMBOLOGÍA:

TABLA DE MODIFICACIONES:

| NO. | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|---|---|---|
| 0 | SEMBRADO DE PEDIDO 1 Y 2 | 01/02/2024 |
| 1 | CAMBIAN RAMPAS DE 3 EMPATADAS A 1 GRANDE Y DOS CHICAS | 23/02/2024 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Se autoriza sembrado de plataformas
de 2.10m y 1.90m
cajon grande cajon chico
29/02/24

| | DIMENSIONES | COLOR | U.H. | CARGA | DISTANCIA DE RESGUARDO | ALTURA DE LEVANTE | # DE EQUIPOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARKING LIFT INDIVIDUAL | 2.10 m X 3.75 m | RAMPA: GRIS PLOMO COLUMNAS: GRIS PLOMO | 2HP @110V | 7,000 LB | 0.90 M | 1.90 m | 21 |
| PARKING LIFT JUEGO DE 3 EMPATADAS | 2 DE 1.90m X 3.75 1 DE 2.10m x 3.75 | RAMPA: GRIS PLOMO COLUMNAS: GRIS PLOMO | 2HP @110V | 7,000 LB | 0.90 M | 1.90 m | 7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 42 |

NOTA:

1.- ANCLAJE DE COLUMNAS A BASE DE TAQUETES EXPANSIVO DE ⅜"x 4"

2.- CANALIZACIÓN CONTACTO Y CLAVIJA DE MEDIO GIRO A PAÑO DE INICIO DE EQUIPO.

OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO

3.- FIRME DE CONCRETO DE 15CM CON UNA RESISTENCIA F´C 250KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECROSOLDADA DE 6.6.10.10




FIRME DE CONCRETO






DESCRIPCIÓN DE EQUIPO
