NOMBRE DE LA EMPRESA:
ZEMPOALA 449

TecnoRampa
INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

CONTENIDO:
- TR ONE
- PARKING LIFT

VENDEDOR A CARGO:
LIC. LUIS FRANCISCO VILLA E.

ÁREA A CARGO DE DISEÑO:
INGENIERÍA DEL PRODUCTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN:

OBSERVACIONES:
- CANALIZACIÓN AÉREA

SIMBOLOGÍA:

Rampas pagadas
2 (dos)

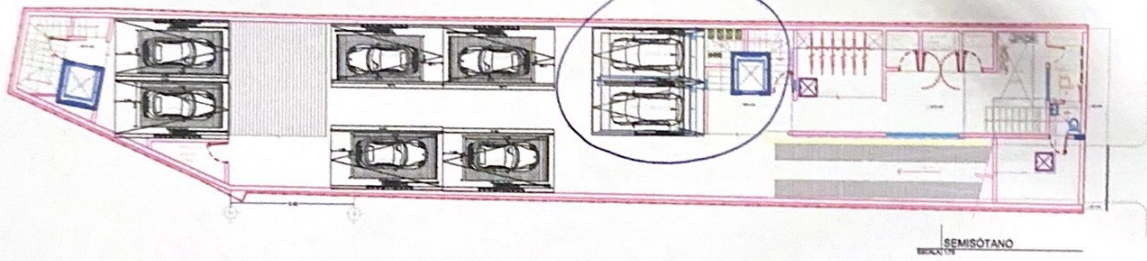

SEMISÓTANO

Acepto OK

5/11/2024 Alcala

TABLA DE MODIFICACIONES:

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA
0	SEMBRADO	22/08/2024

EQUIPO	DIMENSIONES	COLOR	U.H.	CARGA	DISTANCIA DE RESGUARDO	ALTURA DE LEVANTE	# DE EQUIPOS
TR ONE	1.90 x 3.60 m	COLUMNAS: GRIS PLATAFORMA: GRIS	3 HP @220 V	7,000 LB	1.10 m	3.00 m	2
TR ONE	2.00 x 3.75 m	COLUMNAS: GRIS PLATAFORMA: GRIS	3 HP @220 V	7,000 LB	1.00 m	1.80 m	4
PARKING LIFT	2.00 x 3.75 m	COLUMNAS: GRIS PLATAFORMA: GRIS	3 HP @220 V	7,000 LB	0.80 m	1.80 m	2
						TOTAL TR ONE	6
						TOTAL PARKING LIFT	2
						TOTAL DE RAMPAS	8

NOTA:

1.- ANCLAJE DE COLUMNAS A BASE DE TAQUETES EXPANSIVO DE 5/8"

2.- CANALIZACIÓN CONTACTO Y CLAVIJA DE MEDIO GIRO A PAÑO DE INICIO DE EQUIPO.

OBRA CIVIL PARA EL ANCLAJE DEL EQUIPO

3.- FIRME DE CONCRETO DE 15CM CON UNA RESISTENCIA F'C 250KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6.6.10.10



FIRME DE CONCRETO



DESCRIPCIÓN DE EQUIPO
