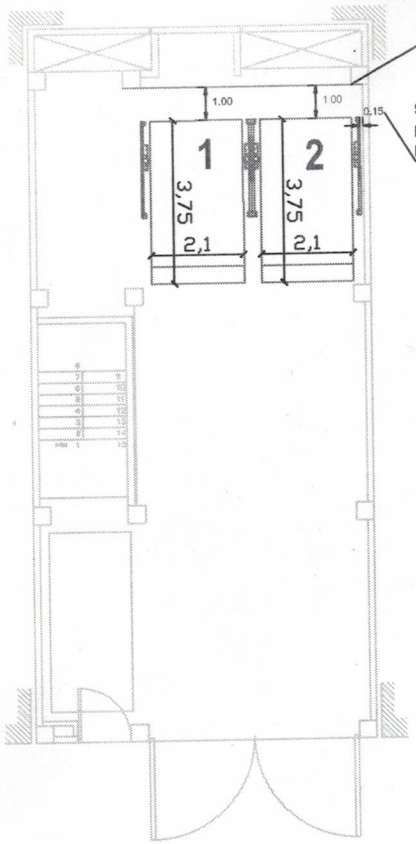

Planta baja
esc. 1:50

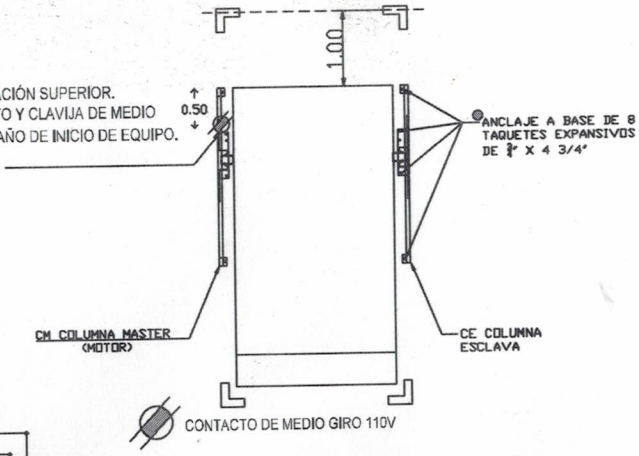

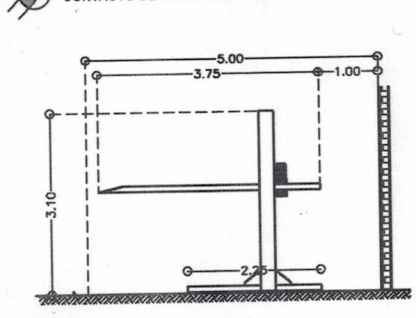

VISTA LATERAL

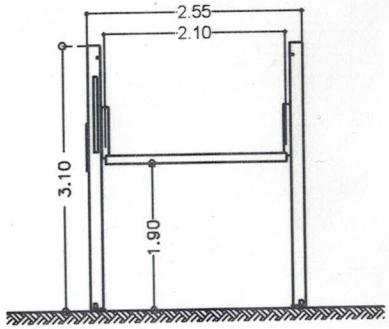

VISTA FRONTAL

CONTACTO DE MEDIO GIRO 110V



EJEMPLO DE CONTACTO Y CLAVIJA, EL CLIENTE SUMINISTRA Y DECIDE, MODELO Y MARCA.

DESCRIPCIÓN DE UNIDAD HIDRÁULICA	
ALIMENTACION	110 VCA
NUMERO DE FASES	1
AMPERS DE CONSUMO	18.5000
WATTS DE CONSUMO	1.5 KW
TIPO DE ACEITE	ISO 68

UNIDAD HIDRAULICA
2HP

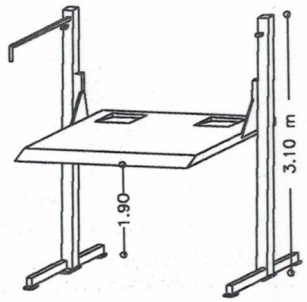

VISTA ISOMÉTRICO

ANCLAJE DE EQUIPOS



Firme: 15 cm de espesor concreto f´c=250 kg/cm2 armado con malla electrosoldada.
En caso de no cumplir con el firme de concreto, se deberá sustituir por una placa de acero de ¾" de espesor por cada columna del equipo.

CLIENTE: ARTURO MORALES
FOLIO: 19095
SUCURSAL: 8752

elevadores.mx

TecnoRampa
SINERGIA EN TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

PROYECTO:
SEMBRADO DE RAMPAS

CARACTERÍSTICAS
02 EQUIPOS TR EVOLUTION DE 2.10M x 3.75M
- Altura de Levante 1.90m
- Canalización superior.
- Unidad hidráulica de 2 HP.
- Alimentación Monofásica 110V (fase, un neutro y una tierra física) e interruptor termomágnetico de 1x 30Amp libres de consumo por cada equipo, el remate en el equipo es a base de un contacto y clavija de medio giro, el cliente suministra y decide, marca y modelo.
- Distancia de resguardo según sembrado.
- Color de línea.
Columna, negro texturizado.
Plataforma, gris plomo.

VO.BO.

Arq. Arturo MoralesMtz

NOMBRE Y FIRMA

EL VO.BO. POR PARTE DEL CLIENTE AVALA EL SEMBRADO DE EQUIPOS

ARQ. ARTURO MORALES

PROYECTO:
UBICACIÓN: CALLE ROLANDO, COL. INDUSTRIAL, C.P. 07800, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CDMX.
FECHA: DICIEMBRE 2018
PROPIETARIO:
ESCALA: S/N
LEVANTAMIENTO: ARQ. EVELINA H.
PROCESO:
COTIZACIÓN: MTS.
HOJA: A/1
